

COMMUNE DE ROQUEFORT LES PINS

RD 2085 - PR 15 + 315

AMENAGEMENT D'UN CARREFOUR GIRATOIRE
ECOLE MARIA MATER

Maître D'ouvrage :

SDA LITTORAL OUEST ANTIBES
CANTON DE VILLENEUVE LOUBET

Maître D'oeuvre :

SDA LITTORAL OUEST ANTIBES
CANTON DE VILLENEUVE LOUBET

Indice	Modifications	Date	Dessinateur
A	Première émission	30/03/17	LIO
B	Modifications suivant mail du 31/03/17	04/04/17	LIO
C	Modification des panneaux	11/04/17	LIO
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.

Emetteur document :



AGENCE DE NICE
217, Route de Grenoble - 06200 NICE
T/04 93 83 25 57 - F/04 93 21 66 09
E-mail: nice@eurovia.com

Complément Emetteur:

Titre

CAHIER DE PHASAGE
ET DE CIRCULATION

ECHELLE


DATE


11/04/2017

EUR	EXE	CD06	RQF	VRD	PHA	001	C
Emetteur	Phase	Client	Ville	Nature	Type	Numéro pièce	Indice

LEGENDE

- EMPRISE CHANTIER
- CIRCULATION USAGERS
- ZONE TRAVAUX
- K16
- CLOTURE HERAS
- ENROBES PROVISOIRES
- VOIRIE GNT
- TROTTOIR GNT
- VOIRIE GB
- BORDURES
- MUR
- TROTTOIR ENROBES

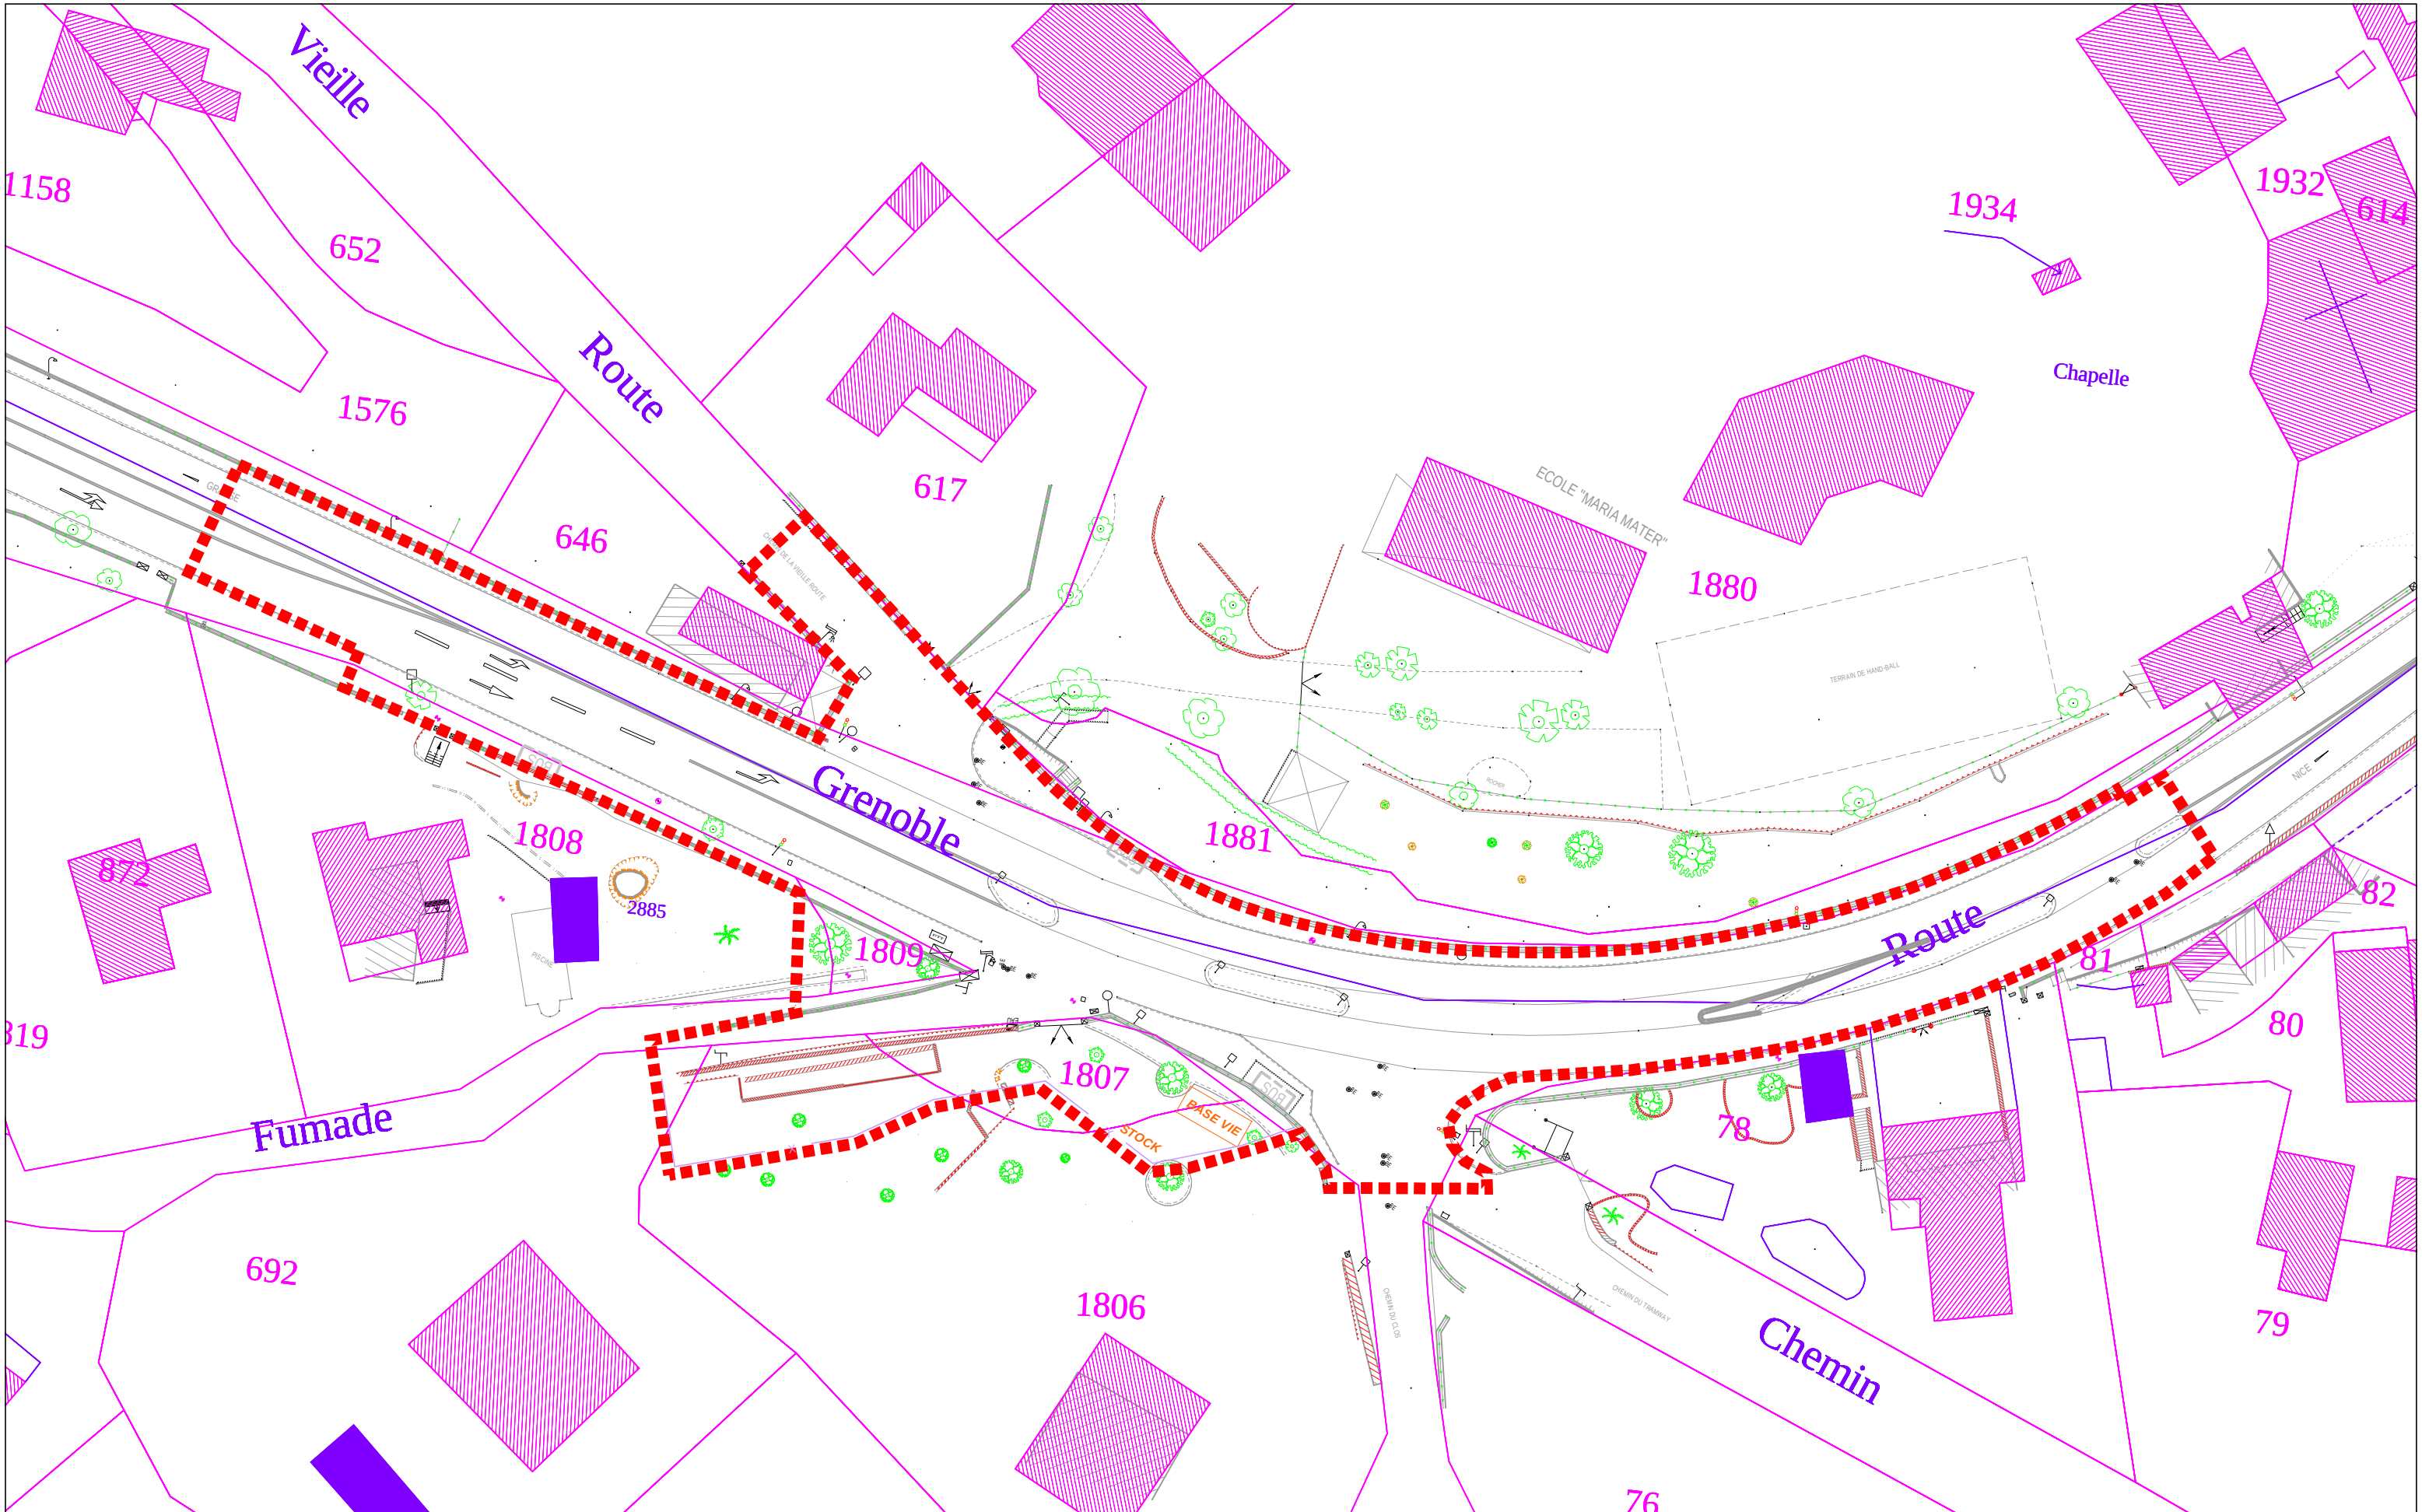


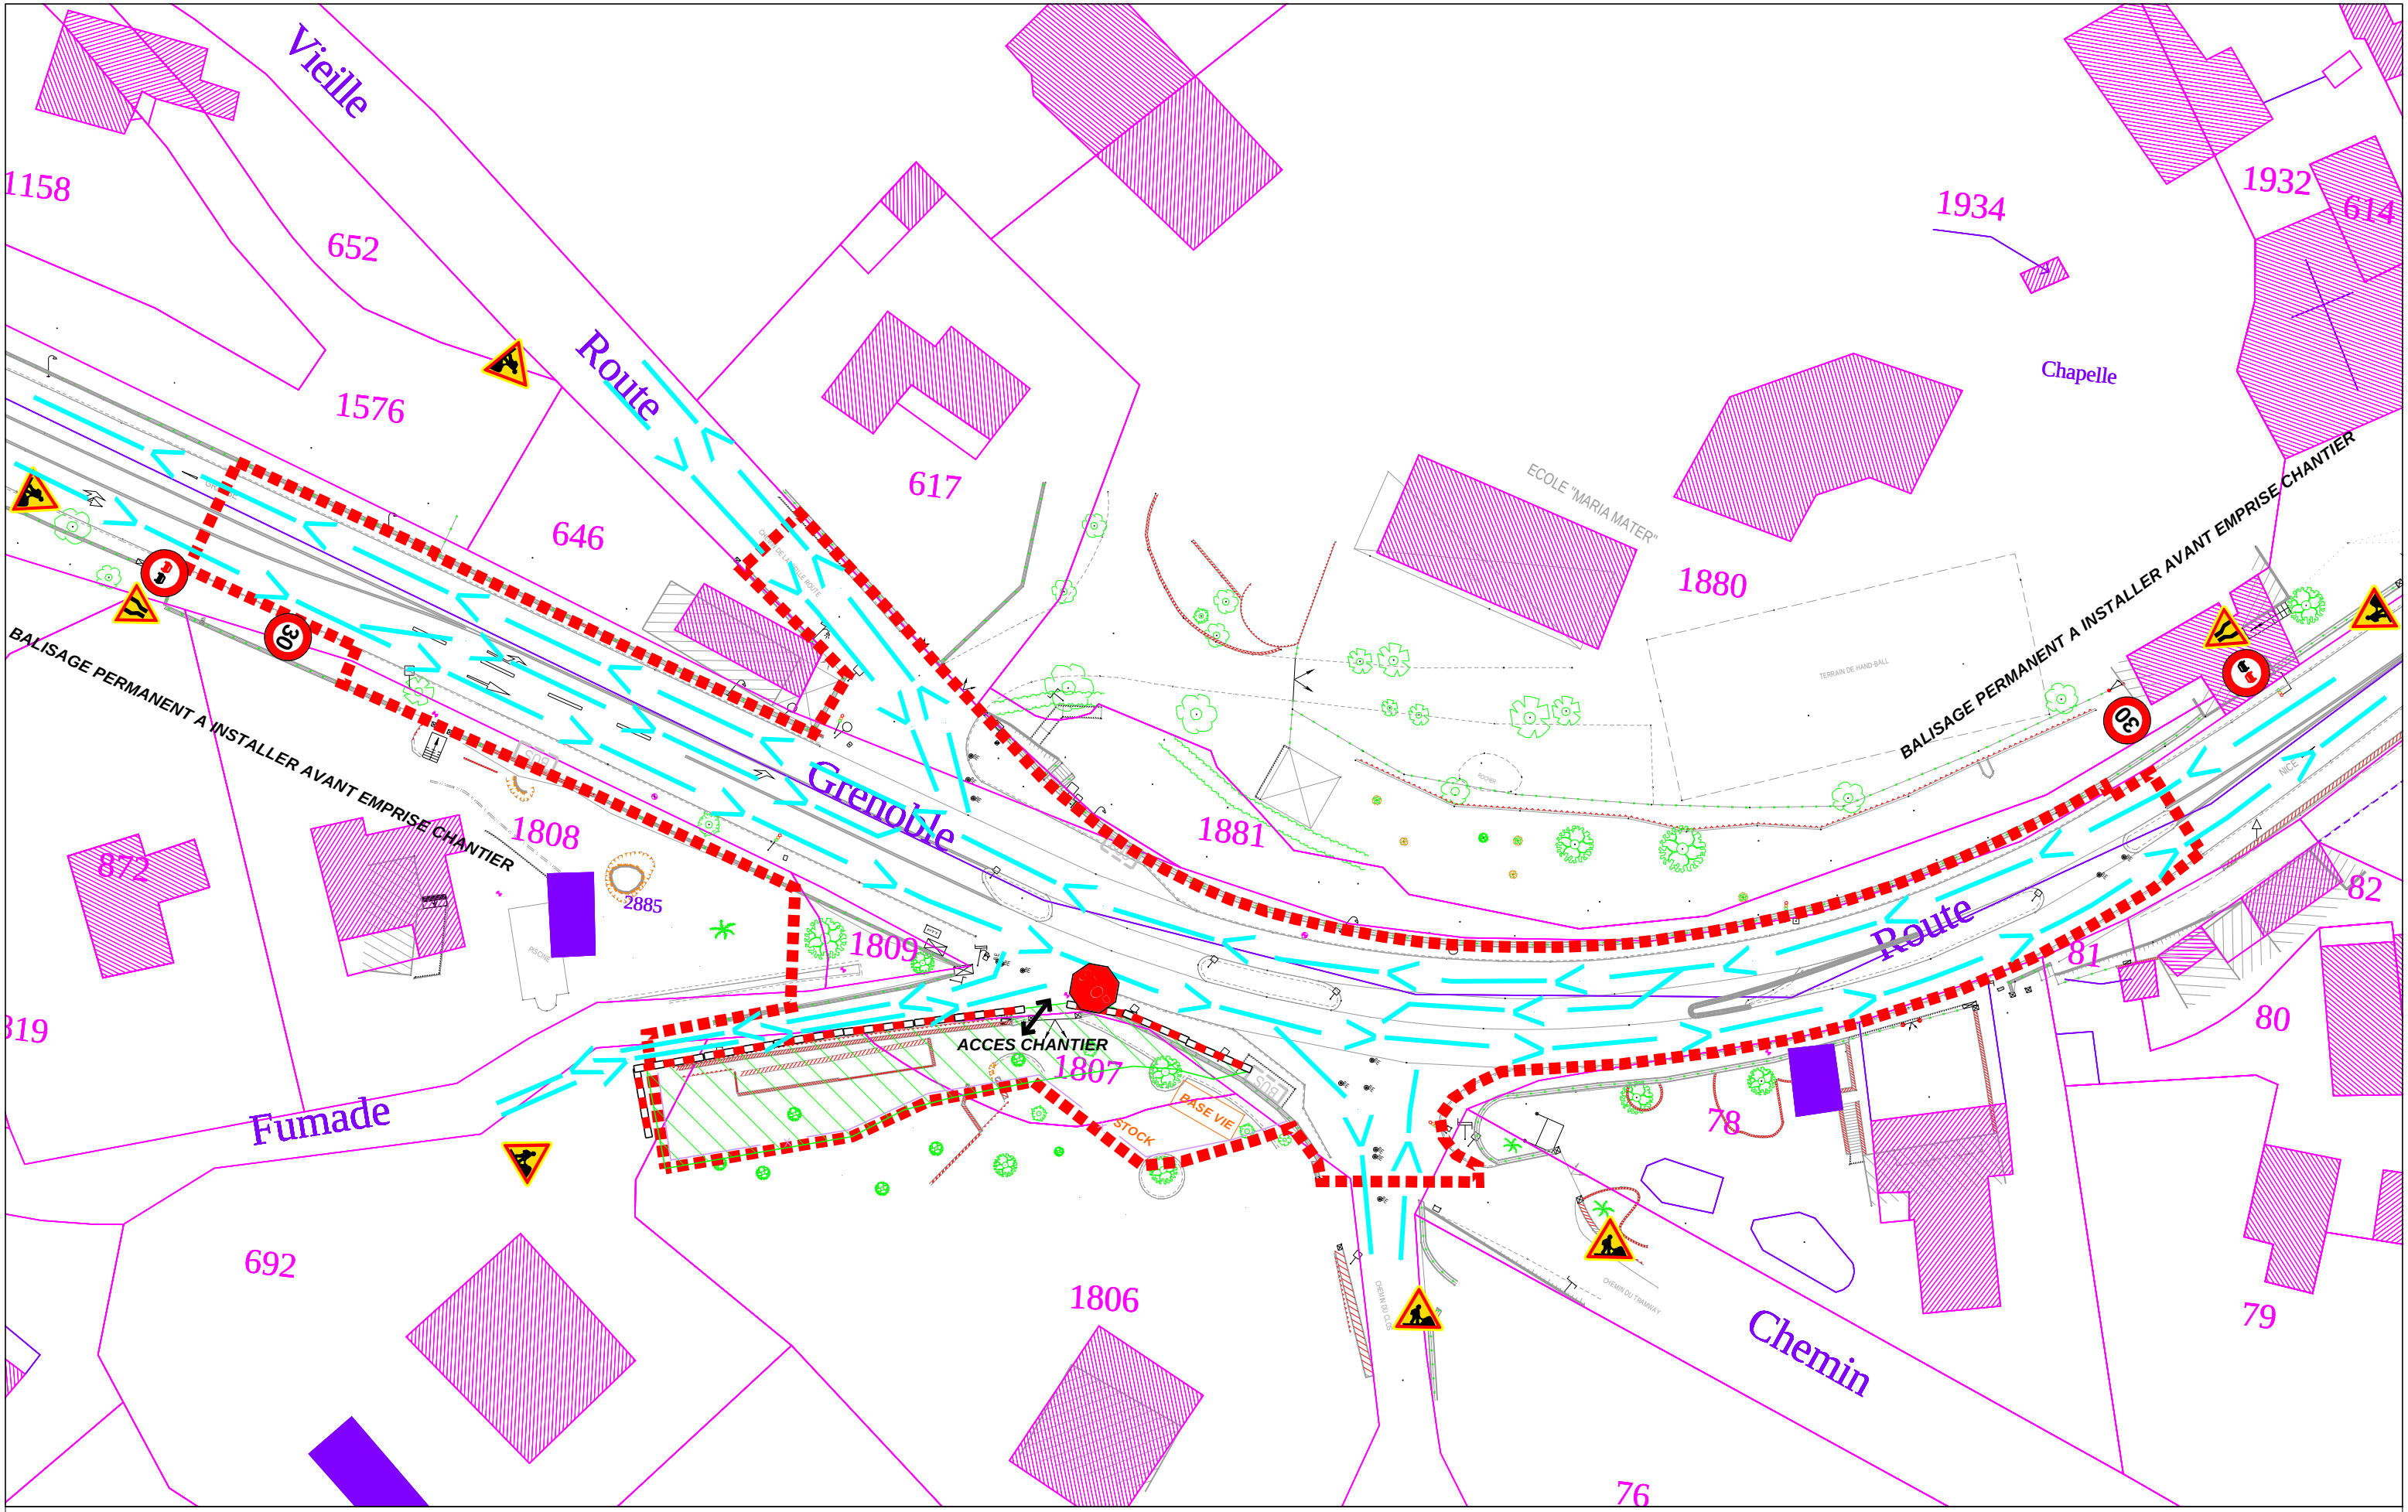

Circulation sur FUMADE identique existant, circulation RD2085 inchangée
Démolition du portail existant, abatage des arbres
Démolition des mur existants et terrassement




PHASE 1 - TERRASSEMENT COTE FERRI

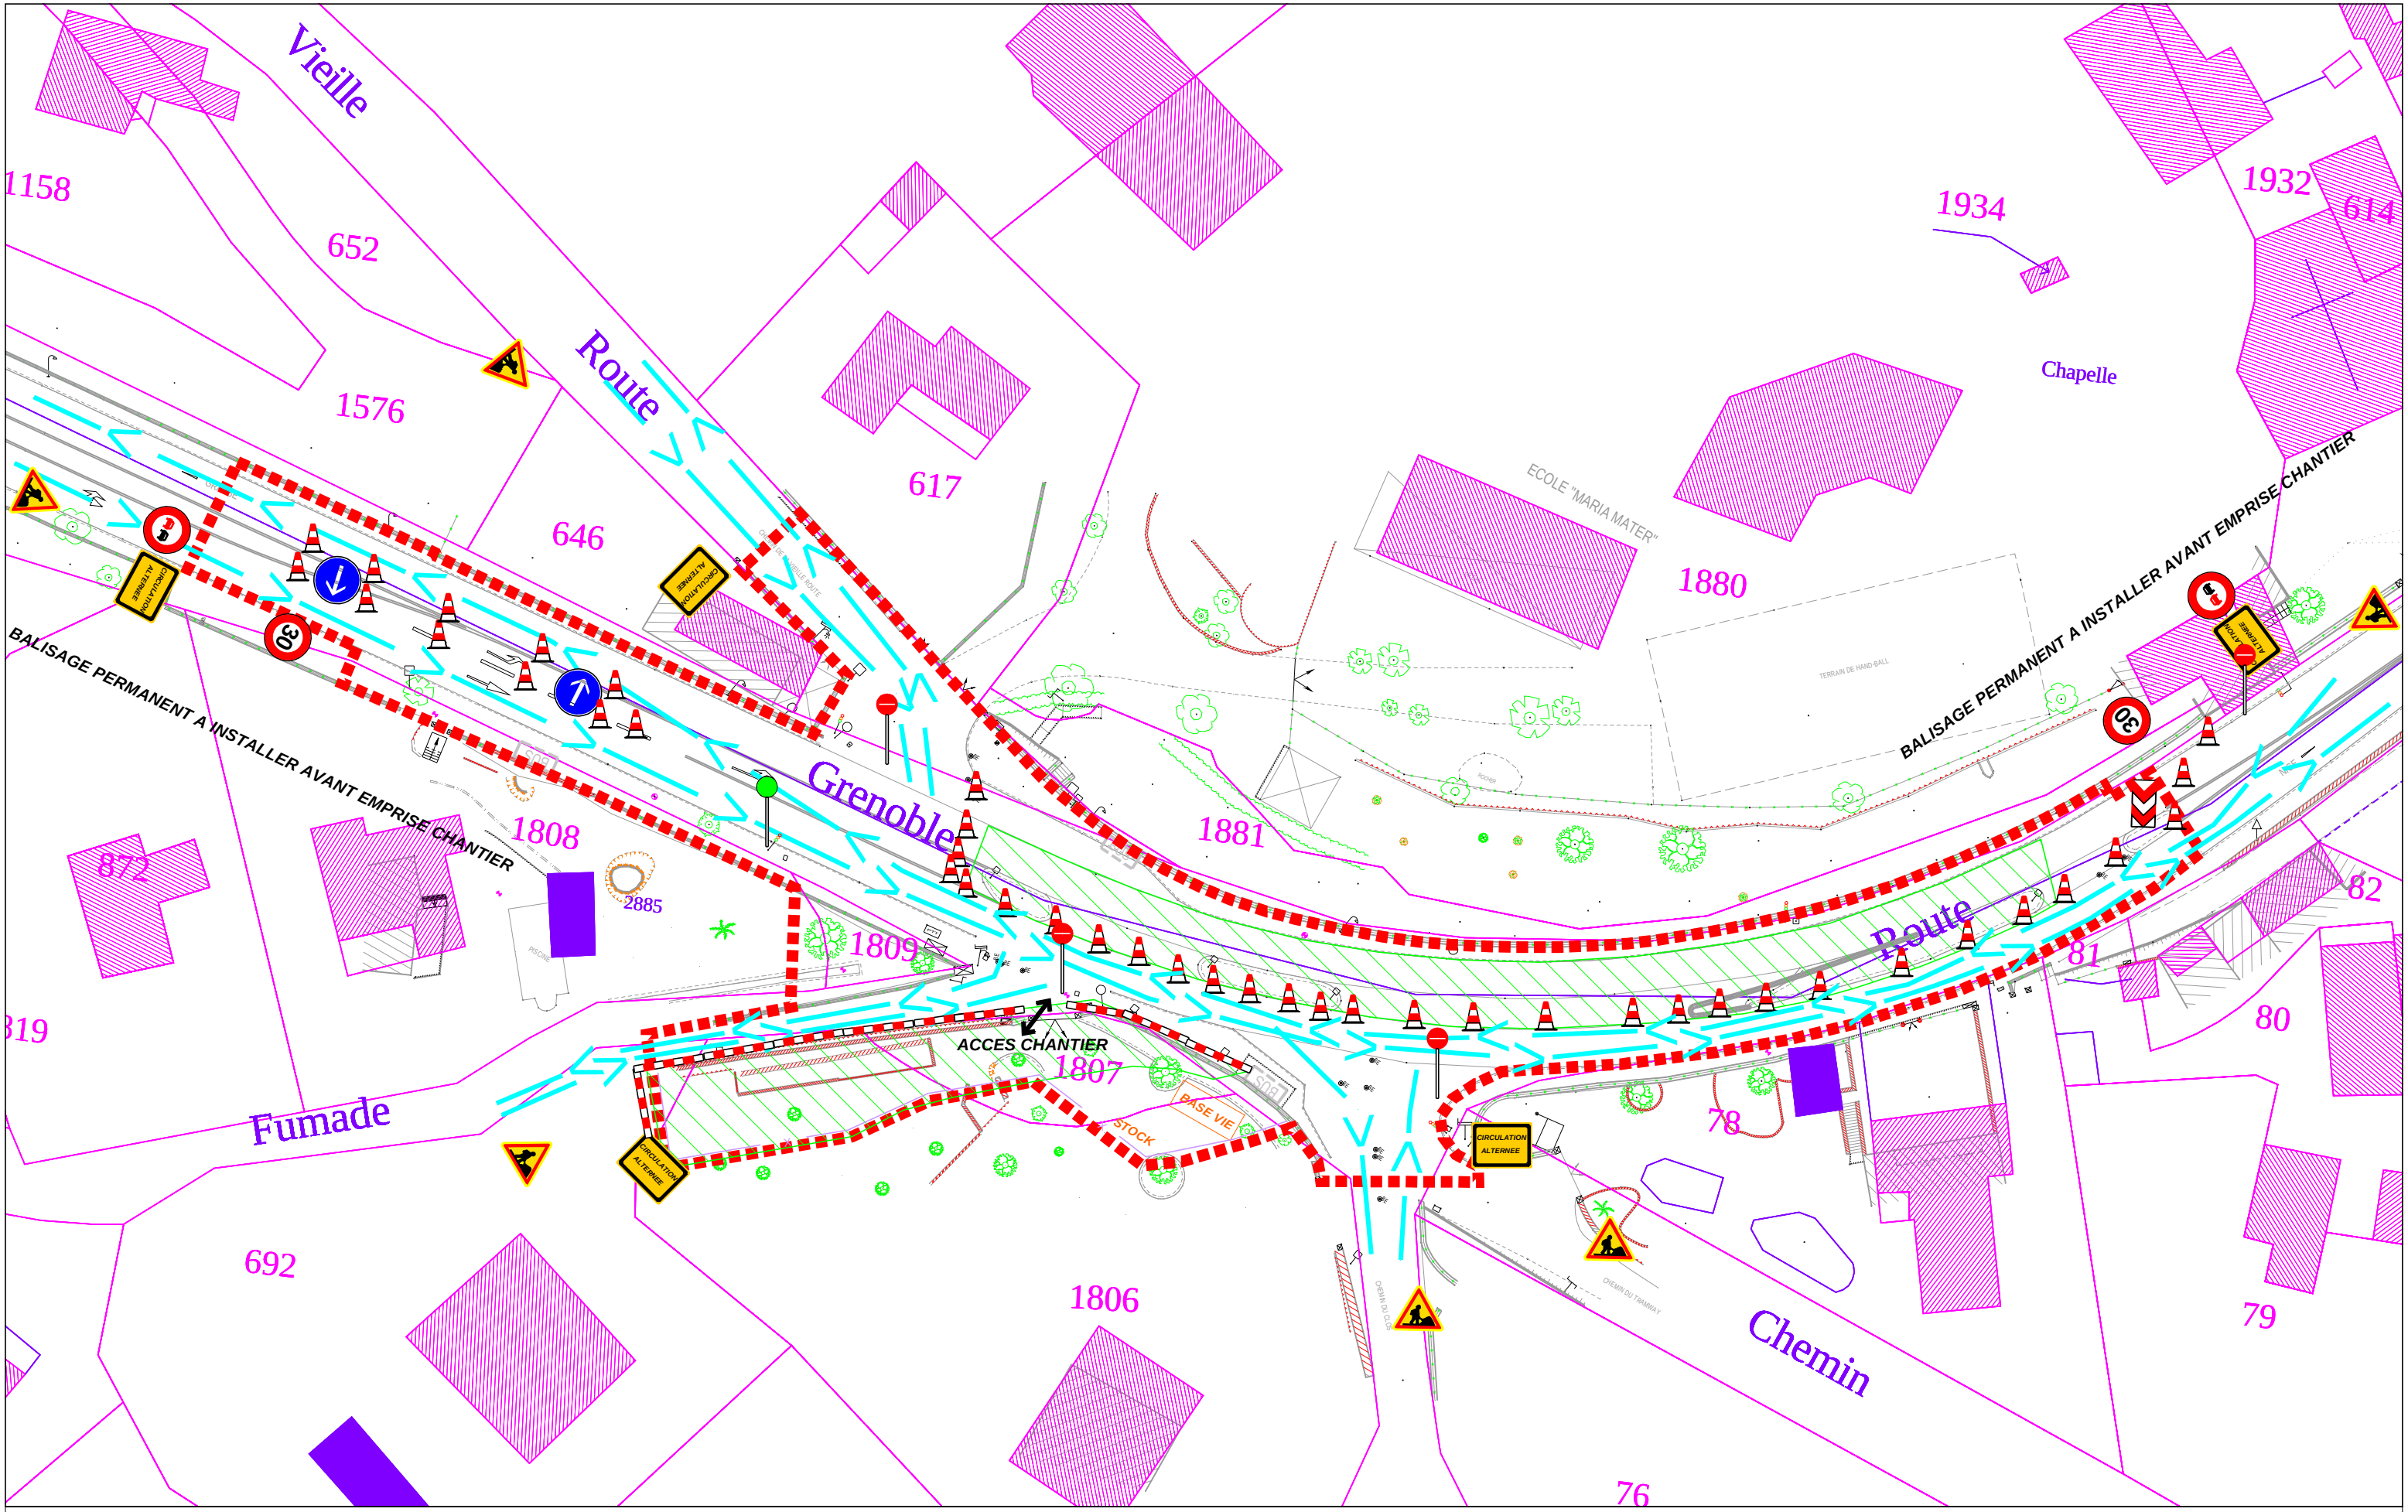

Circulation sur FUMADE identique existant, circulation RD2085 voies réduites, circulation alternée
Feux tricolores en mode clignotant, circulation rétablie le soir, horaires suivant arrete de circulation
Continuité du terrassement cote FERRI, mise en oeuvre de GNT et impregnation pour circulation
Démolition des 3 ilots existants, mise en oeuvre d'enrobés provisoires




**PHASE 2 - TERRASSEMENT COTE FERRI
SUPPRESSION DES ILOTS EXISTANTS**

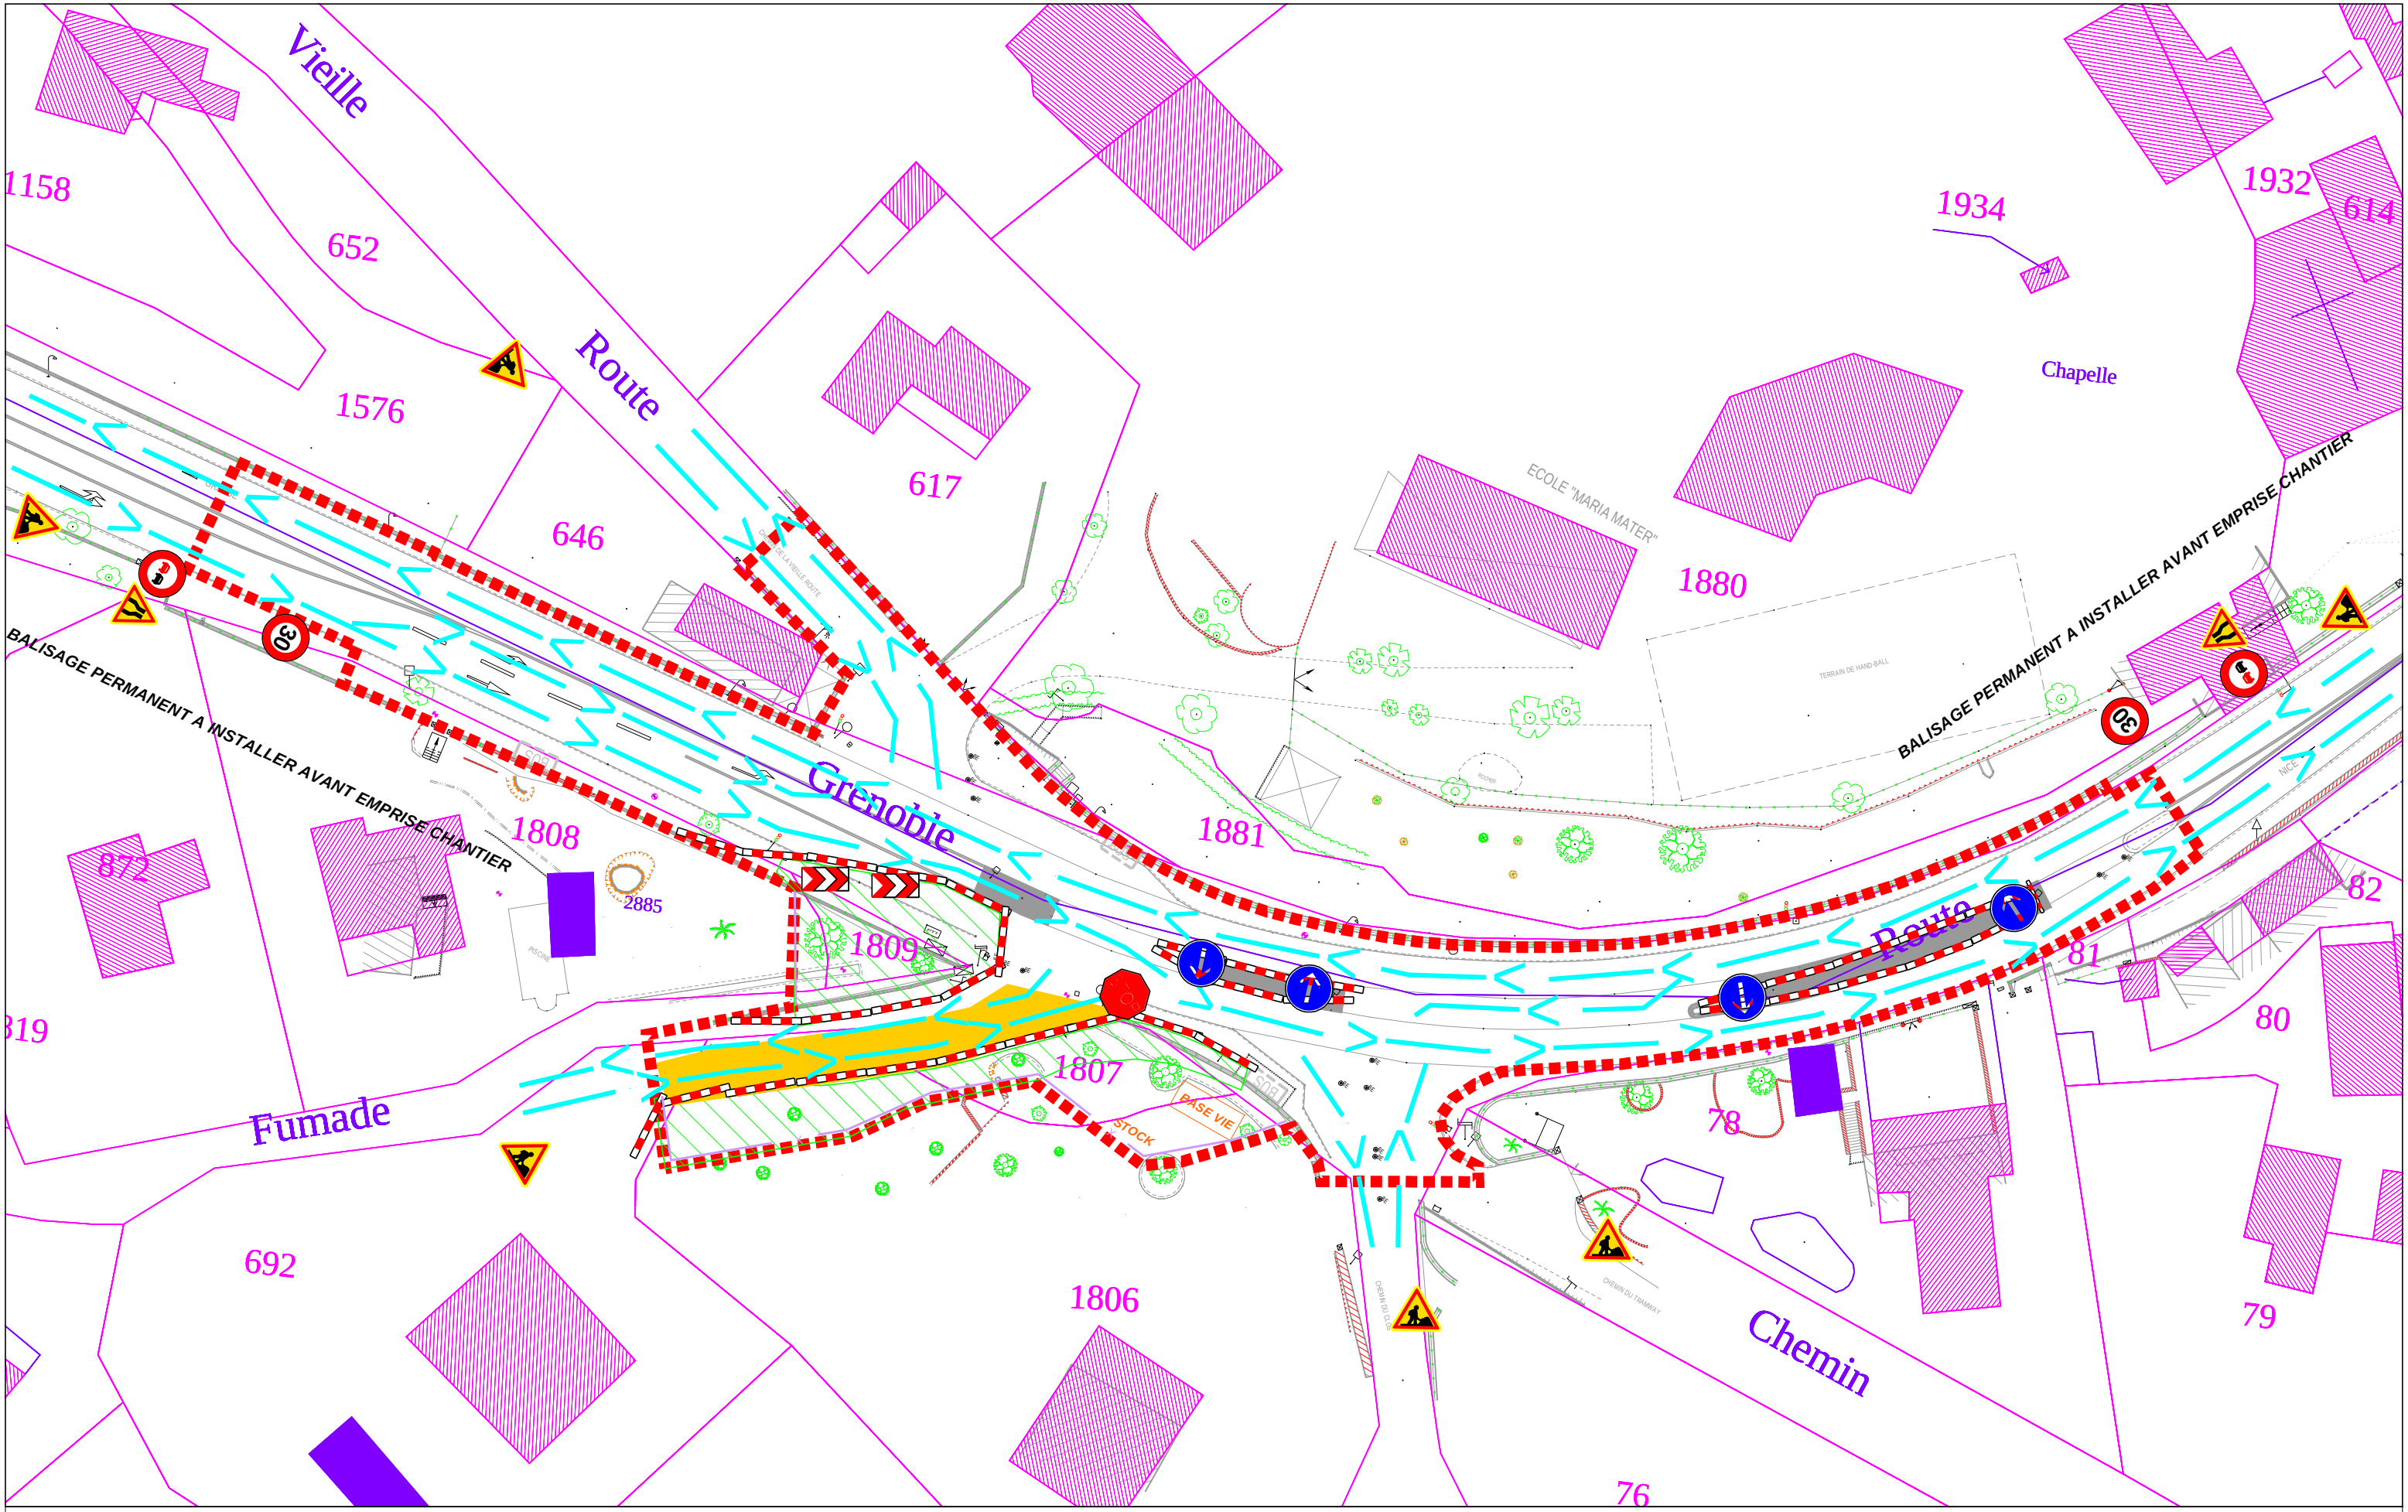

Circulation sur FUMADE basculée sur voie élargie, circulation RD2085 voies réduites, sous feux normaux
Circulation rendue le soir sur RD2085 SUD-OUEST
Cote FERRI, réalisation de la semelle des murs, pose des réseaux secs
Cote RUMFOLA, démolition des existants et terrassement



PHASE 3 - TERRASSEMENT COTE RUMFOLA

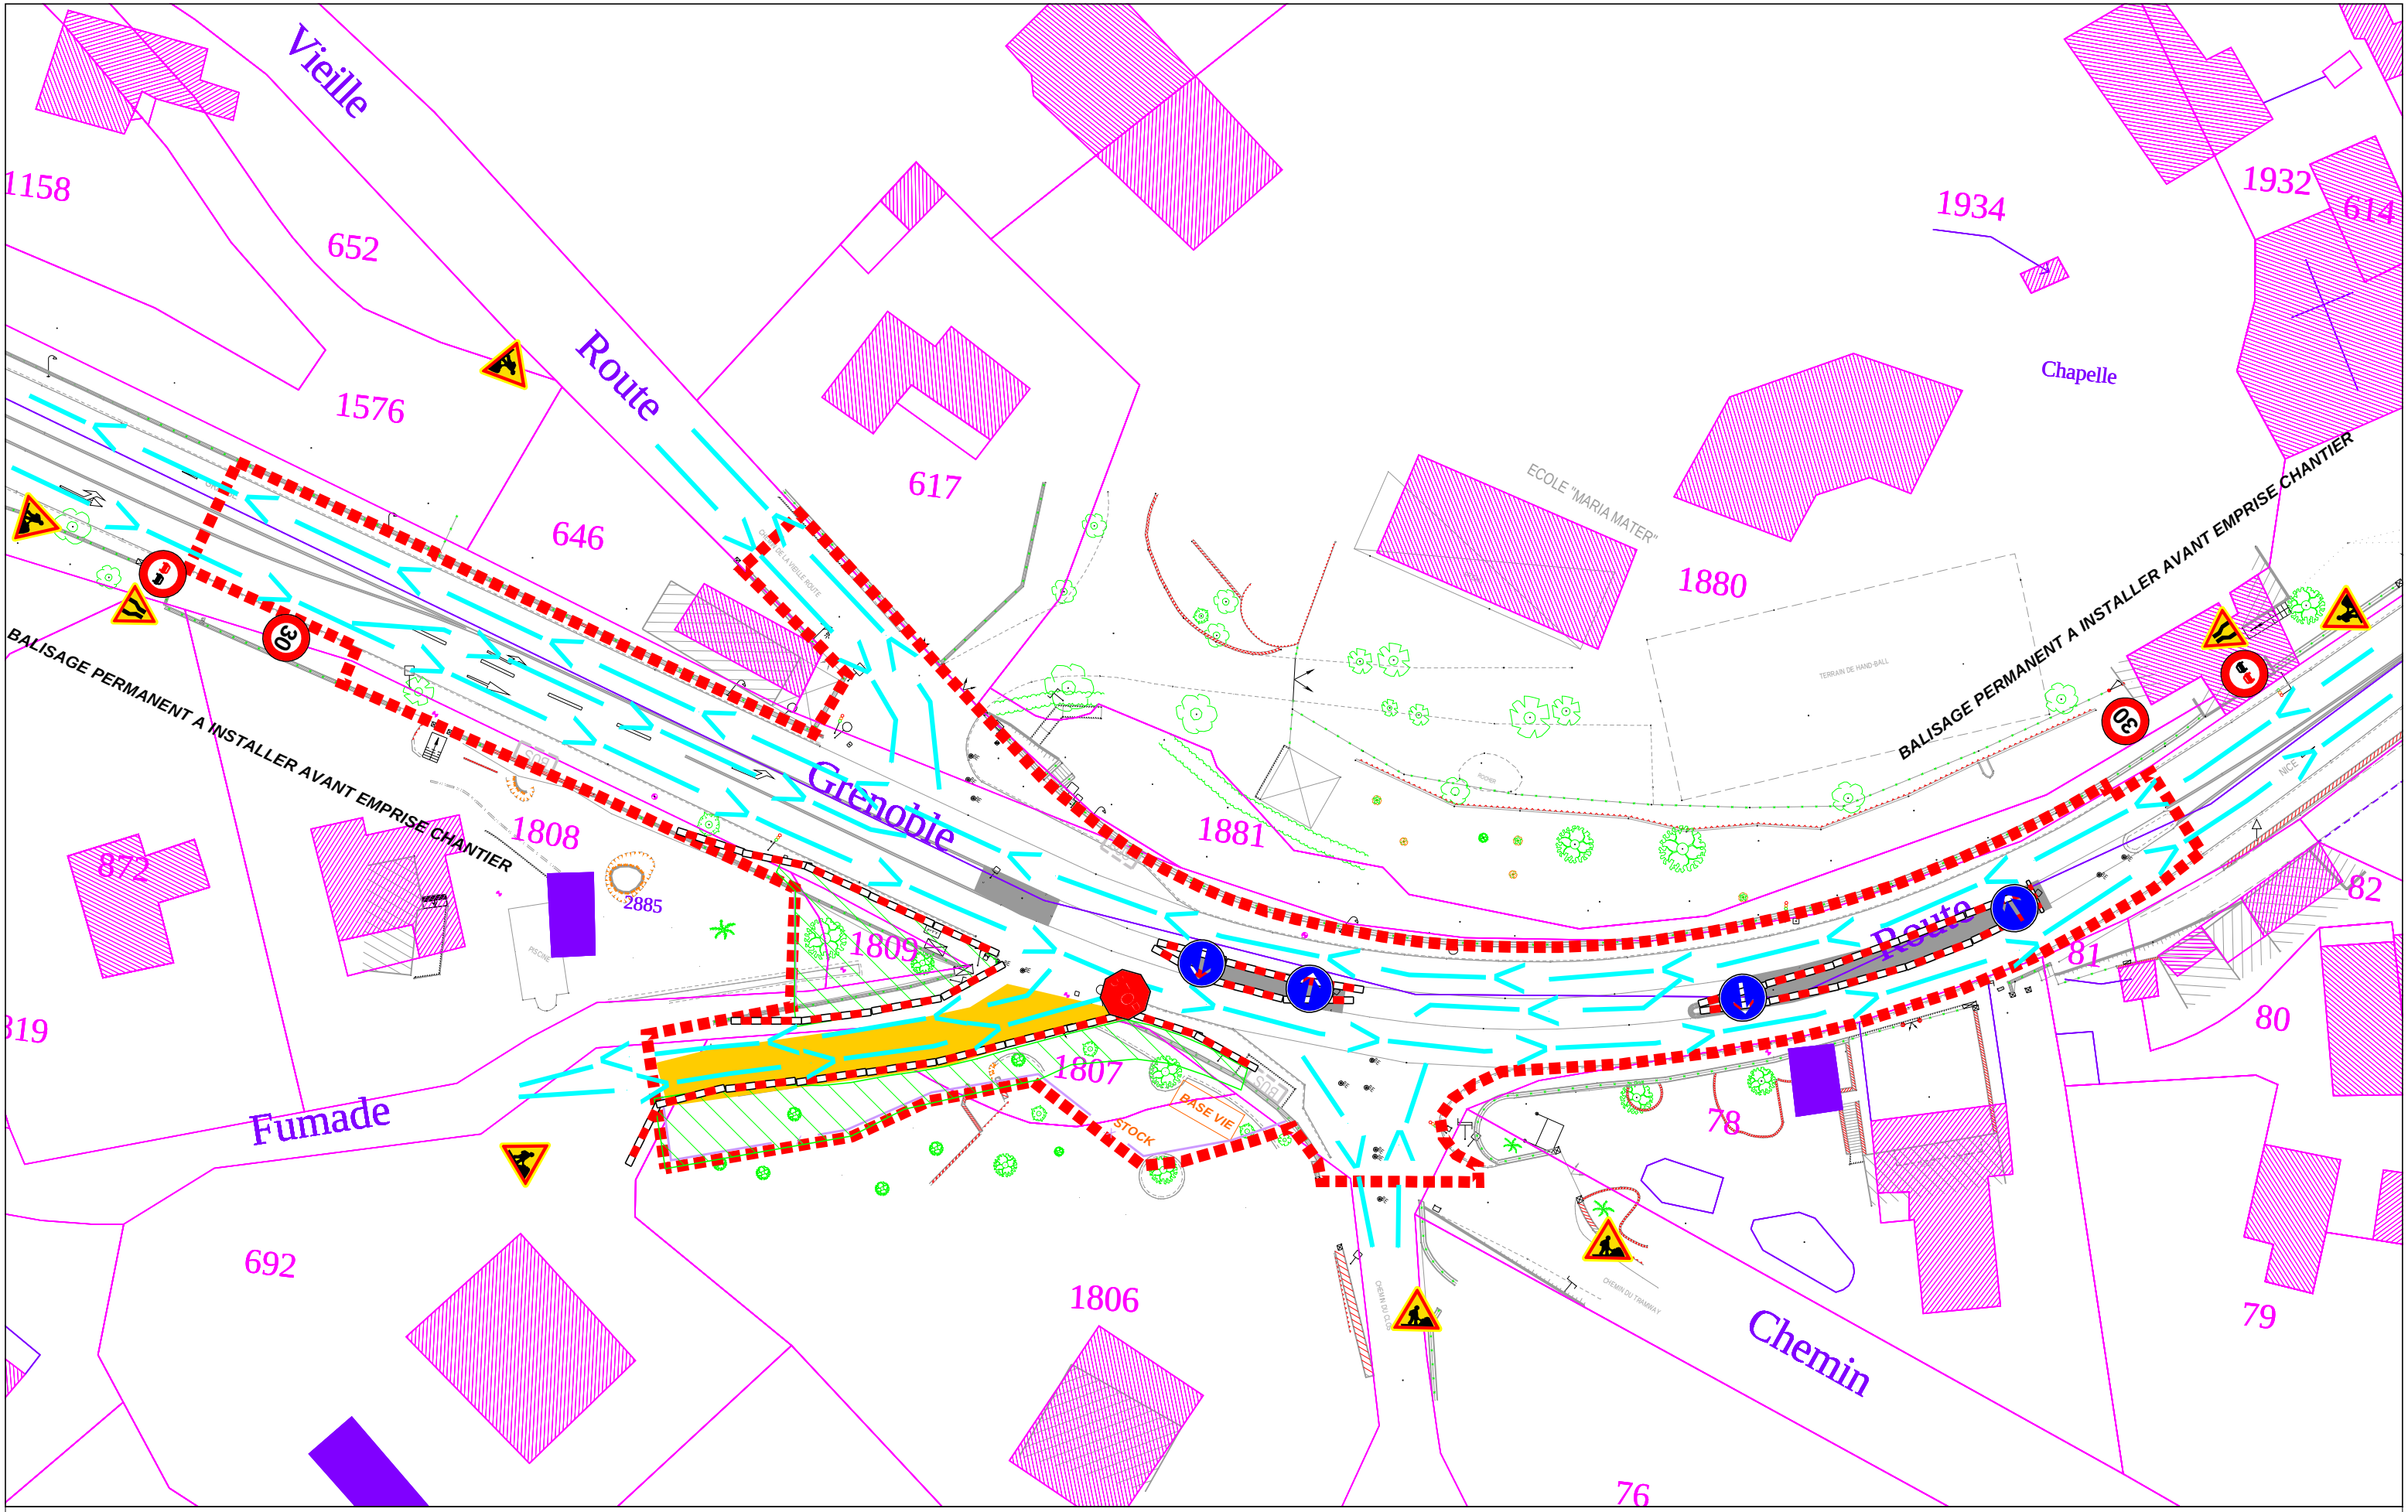


Circulation sur FUMADE basculée sur voie élargie, circulation RD2085, sous feux normaux



**PHASE 4 - SEMELLE COTE RUMFOLA
RESEAUX SECS ET MUR FERRI**

Cote FERRI, réalisation des murs
Cote RUMFOLA, réalisation des semelles des murs et réseaux secs

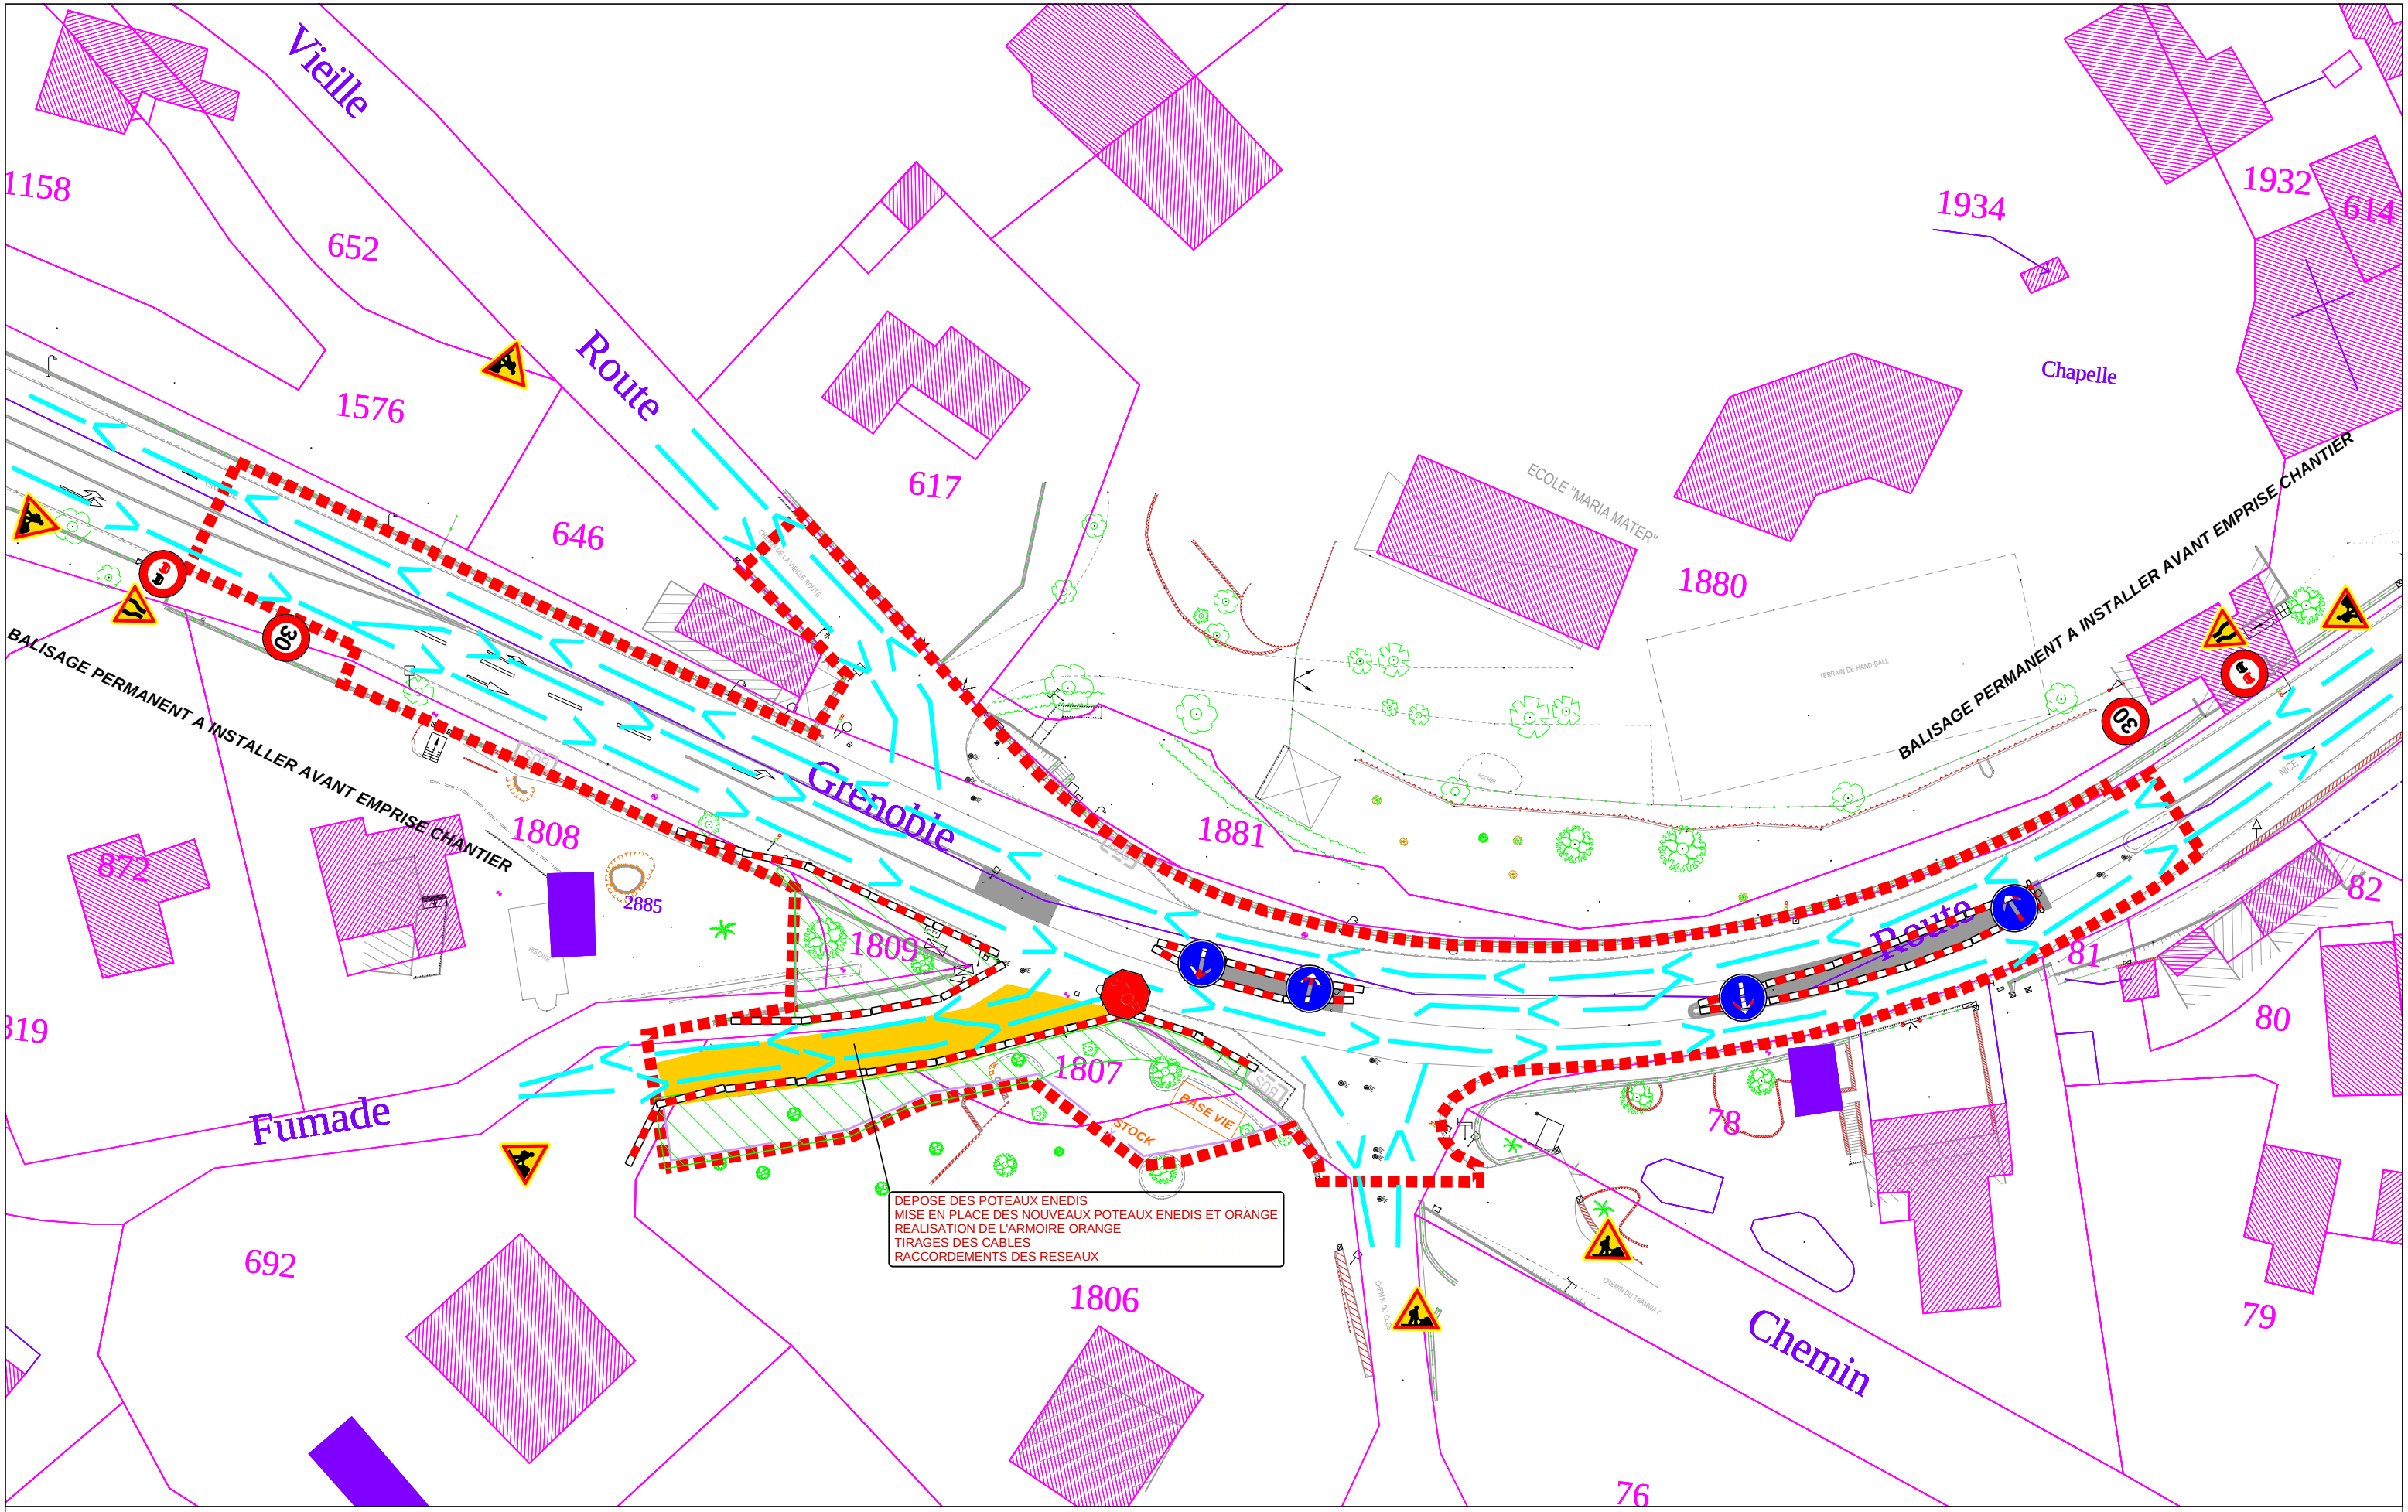


Circulation sur FUMADE basculée sur voie élargie, circulation RD2085, sous feux normaux




**PHASE 5 - MURS RUMFOLA/FERRI
INTERVENTION DES CONCESSIONNAIRES**

Cote FERRI, réalisation des murs
Cote RUMFOLA, réalisation du mur
Intervention des concessionnaires ORANGE ET ENEDIS

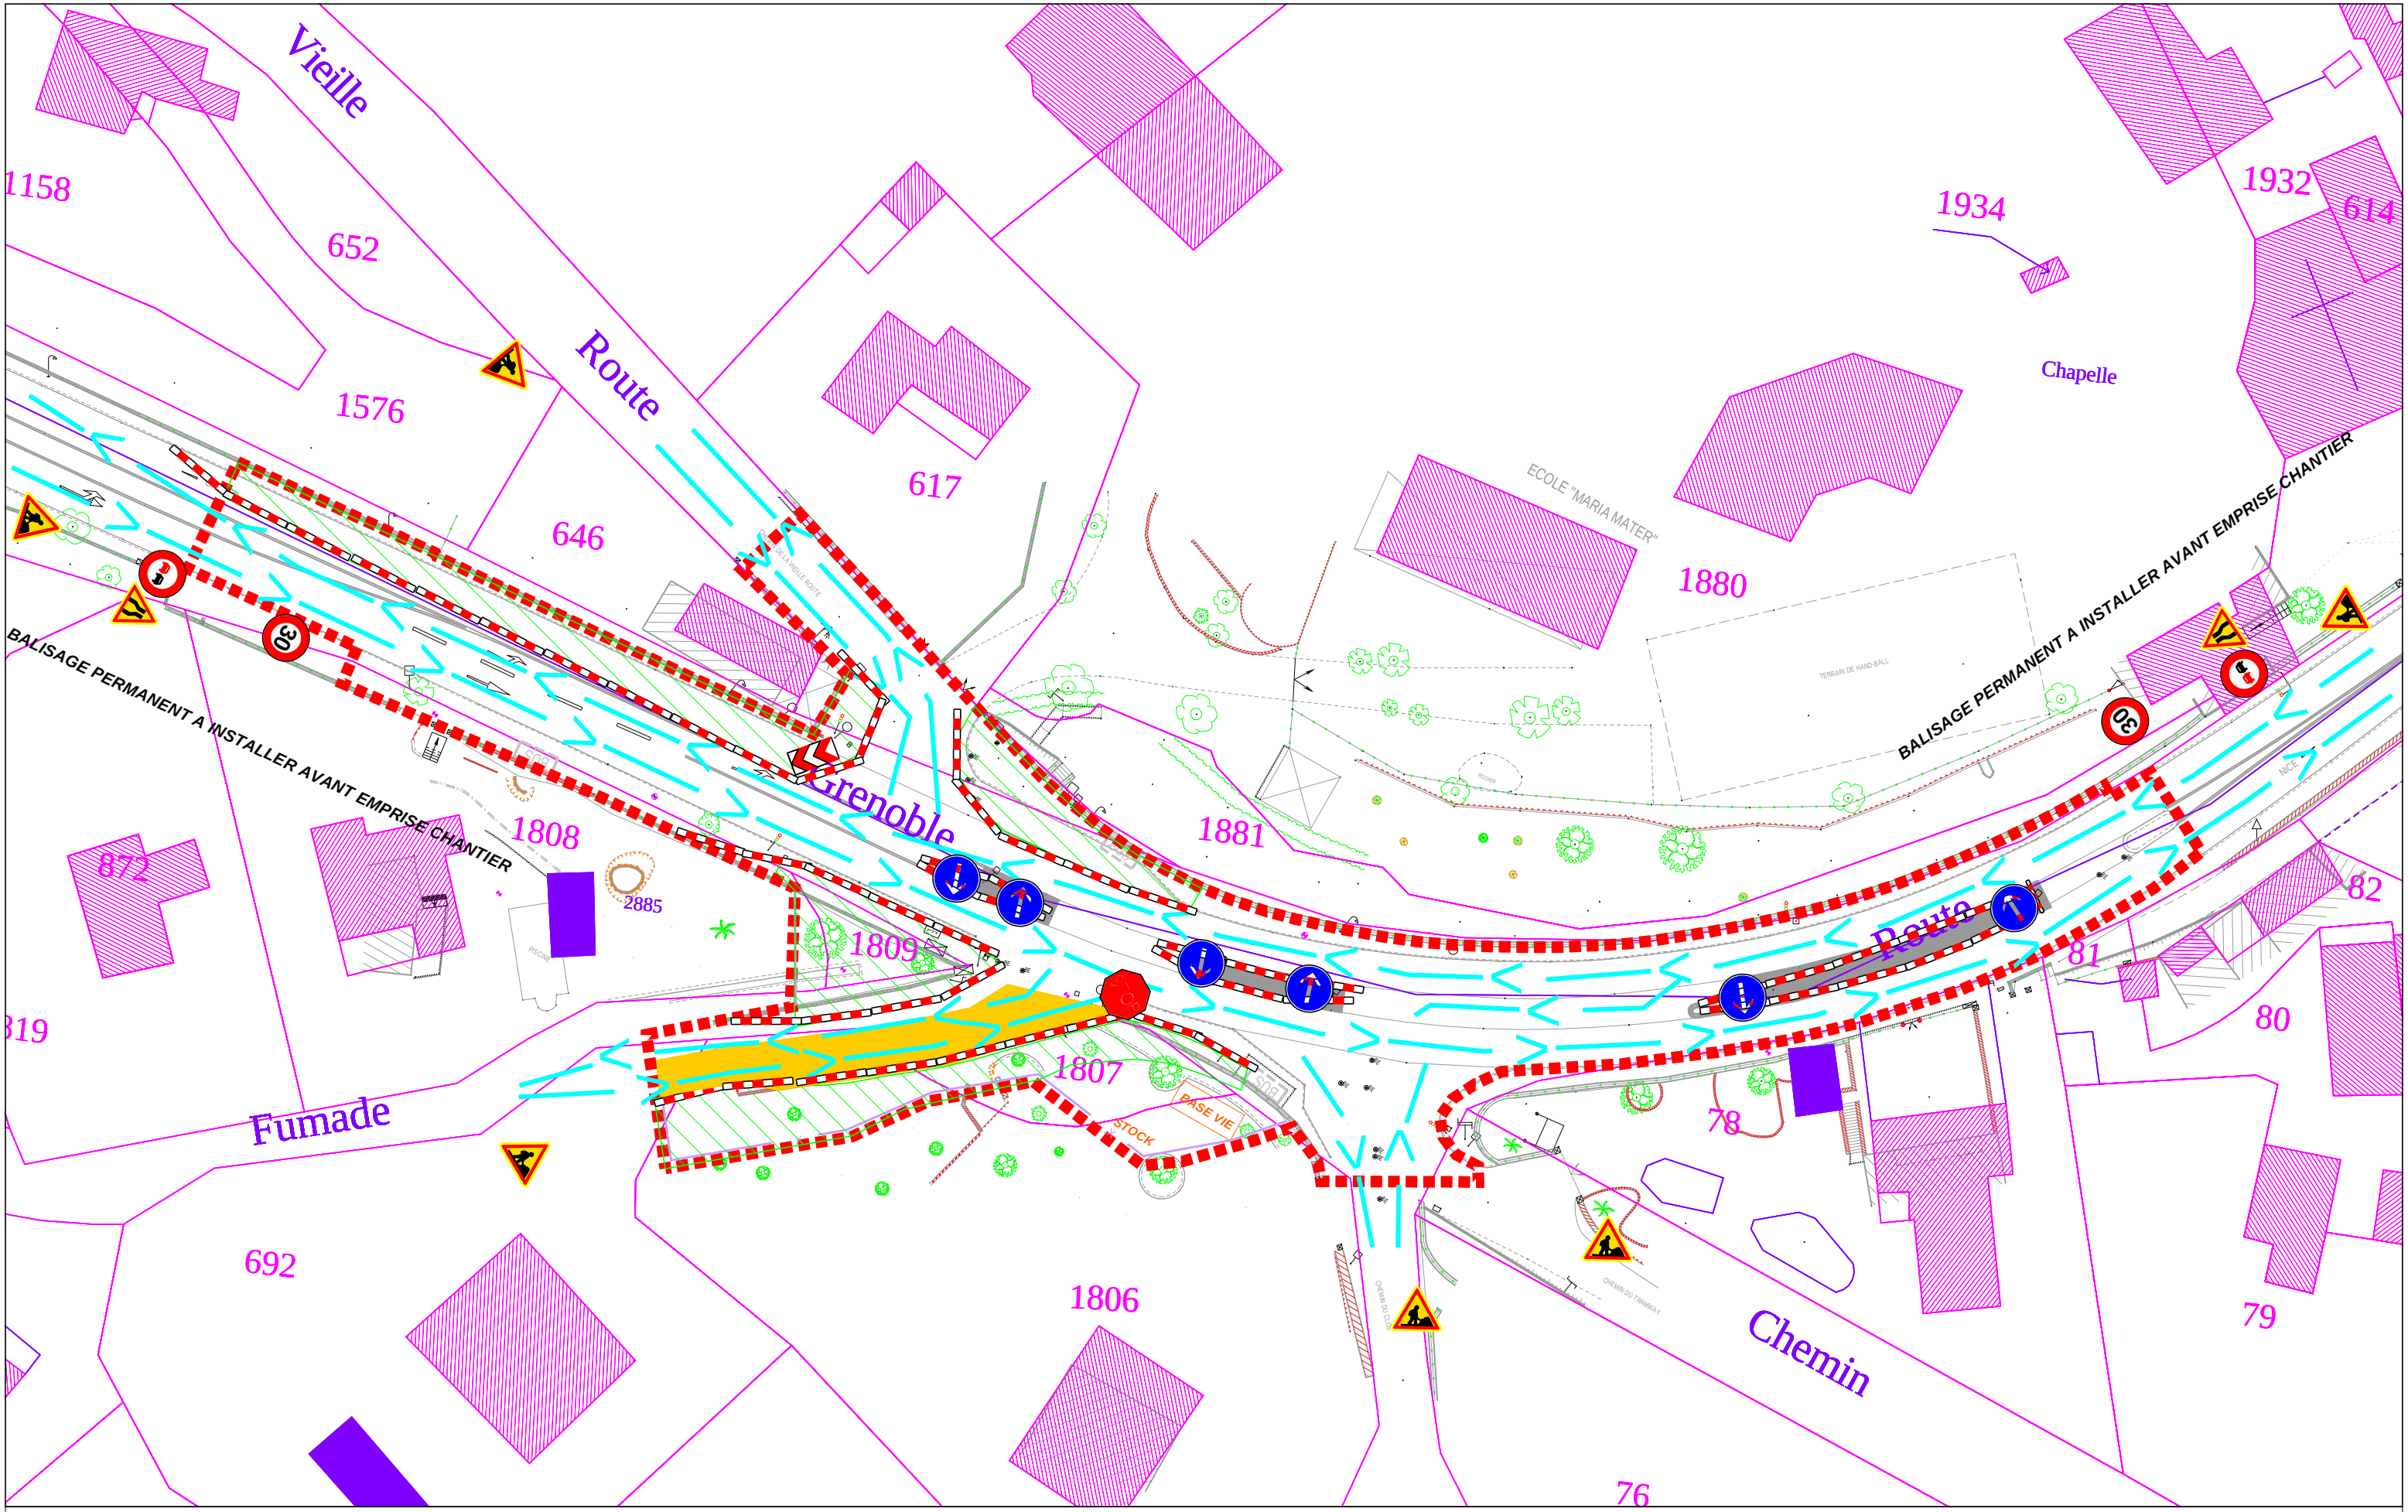


**PHASE 6 - MURS RUMFOLA/FERRI
DEMOLITION TROTTOIR RD2085 NORD**

Circulation sur FUMADE sur voie élargie, circulation RD2085 voies réduites, sous feux normaux
Maintien du balisage la nuit
Cote FERRI, réalisation des murs
Cote RUMFOLA, réalisation du mur
Démolition du trottoir RD2085 NORD - OUEST et réalisation du nouveau trottoir
Démolition du trottoir GIRATOIRE NORD

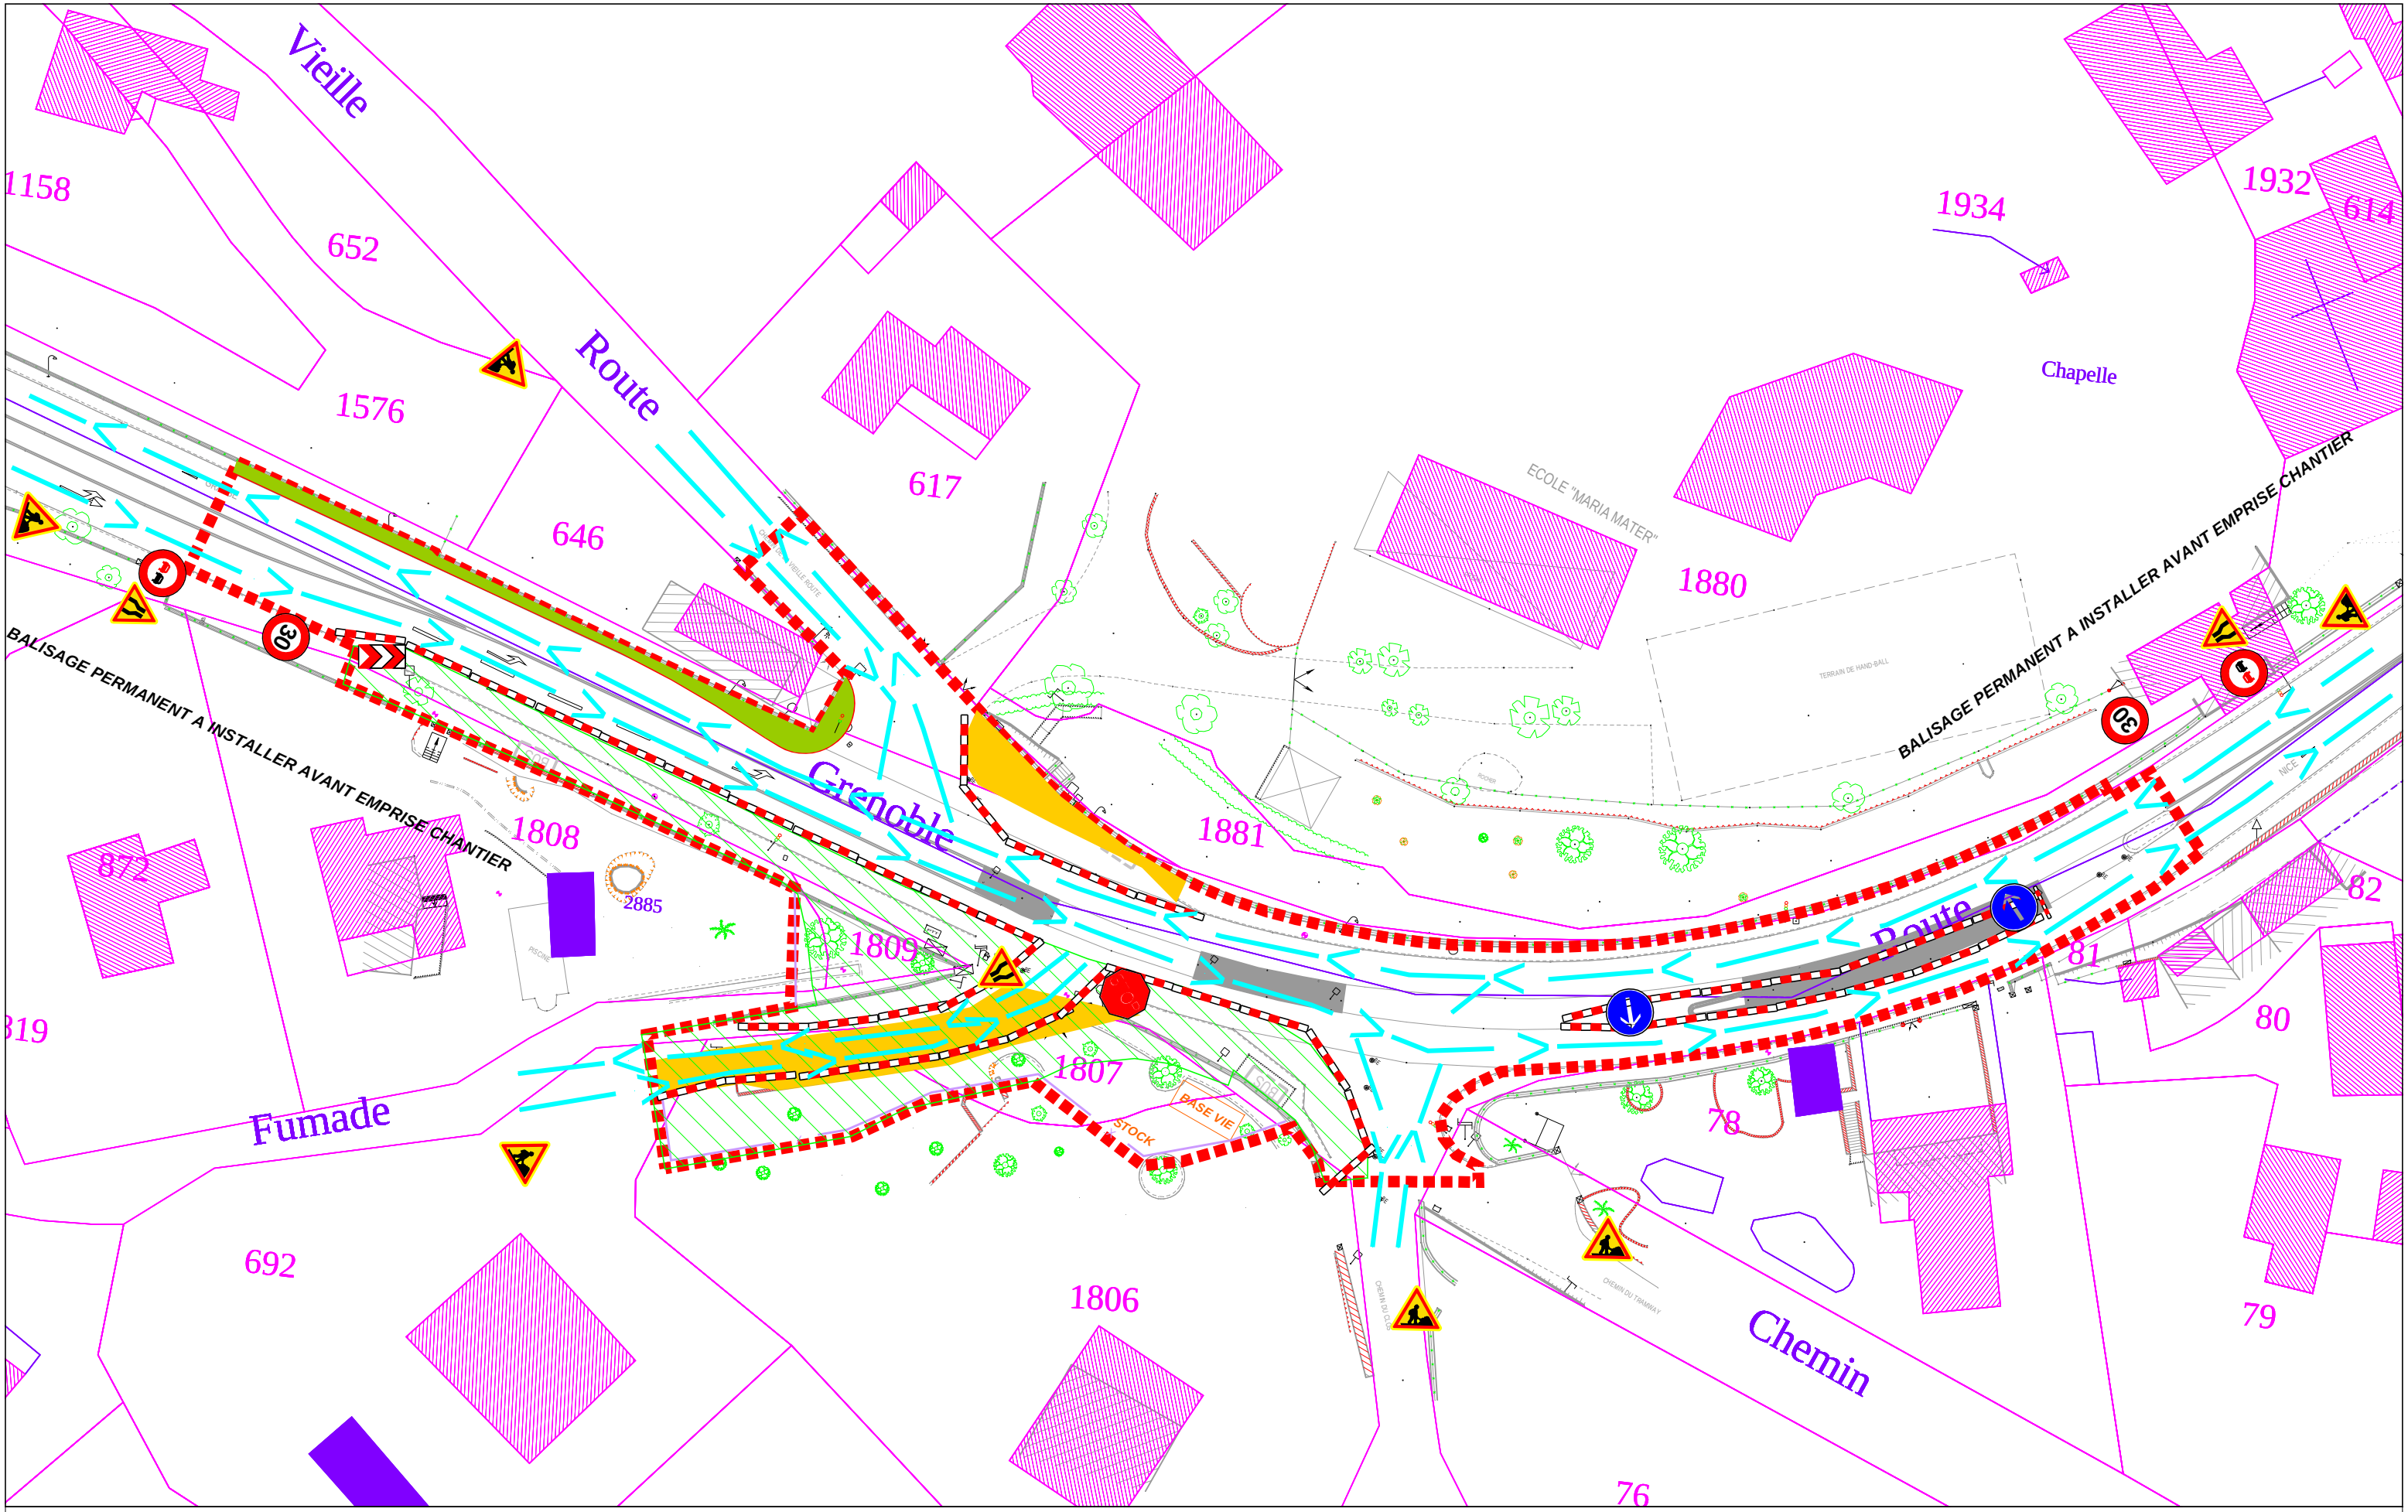

**PHASE 7 - TROTTOIRS COTE SUD
REALISATION DES COUCHES DE FONDATION**

Circulation sur FUMADE sur demi-chaussée, circulation RD2085 voies réduites, sous feux normaux
Maintien du balisage la nuit, et évolution suivant avancement FUMADE
Réalisation des trottoirs SUD, pose des bordures et GNT
Chemin de la FUMADE: réalisation des couches de GNT
Chemin de la FUMADE + RD2085 demi-giratoire : réalisation de la couche de GB de nuit
Mise en oeuvre des clôtures sur les murs

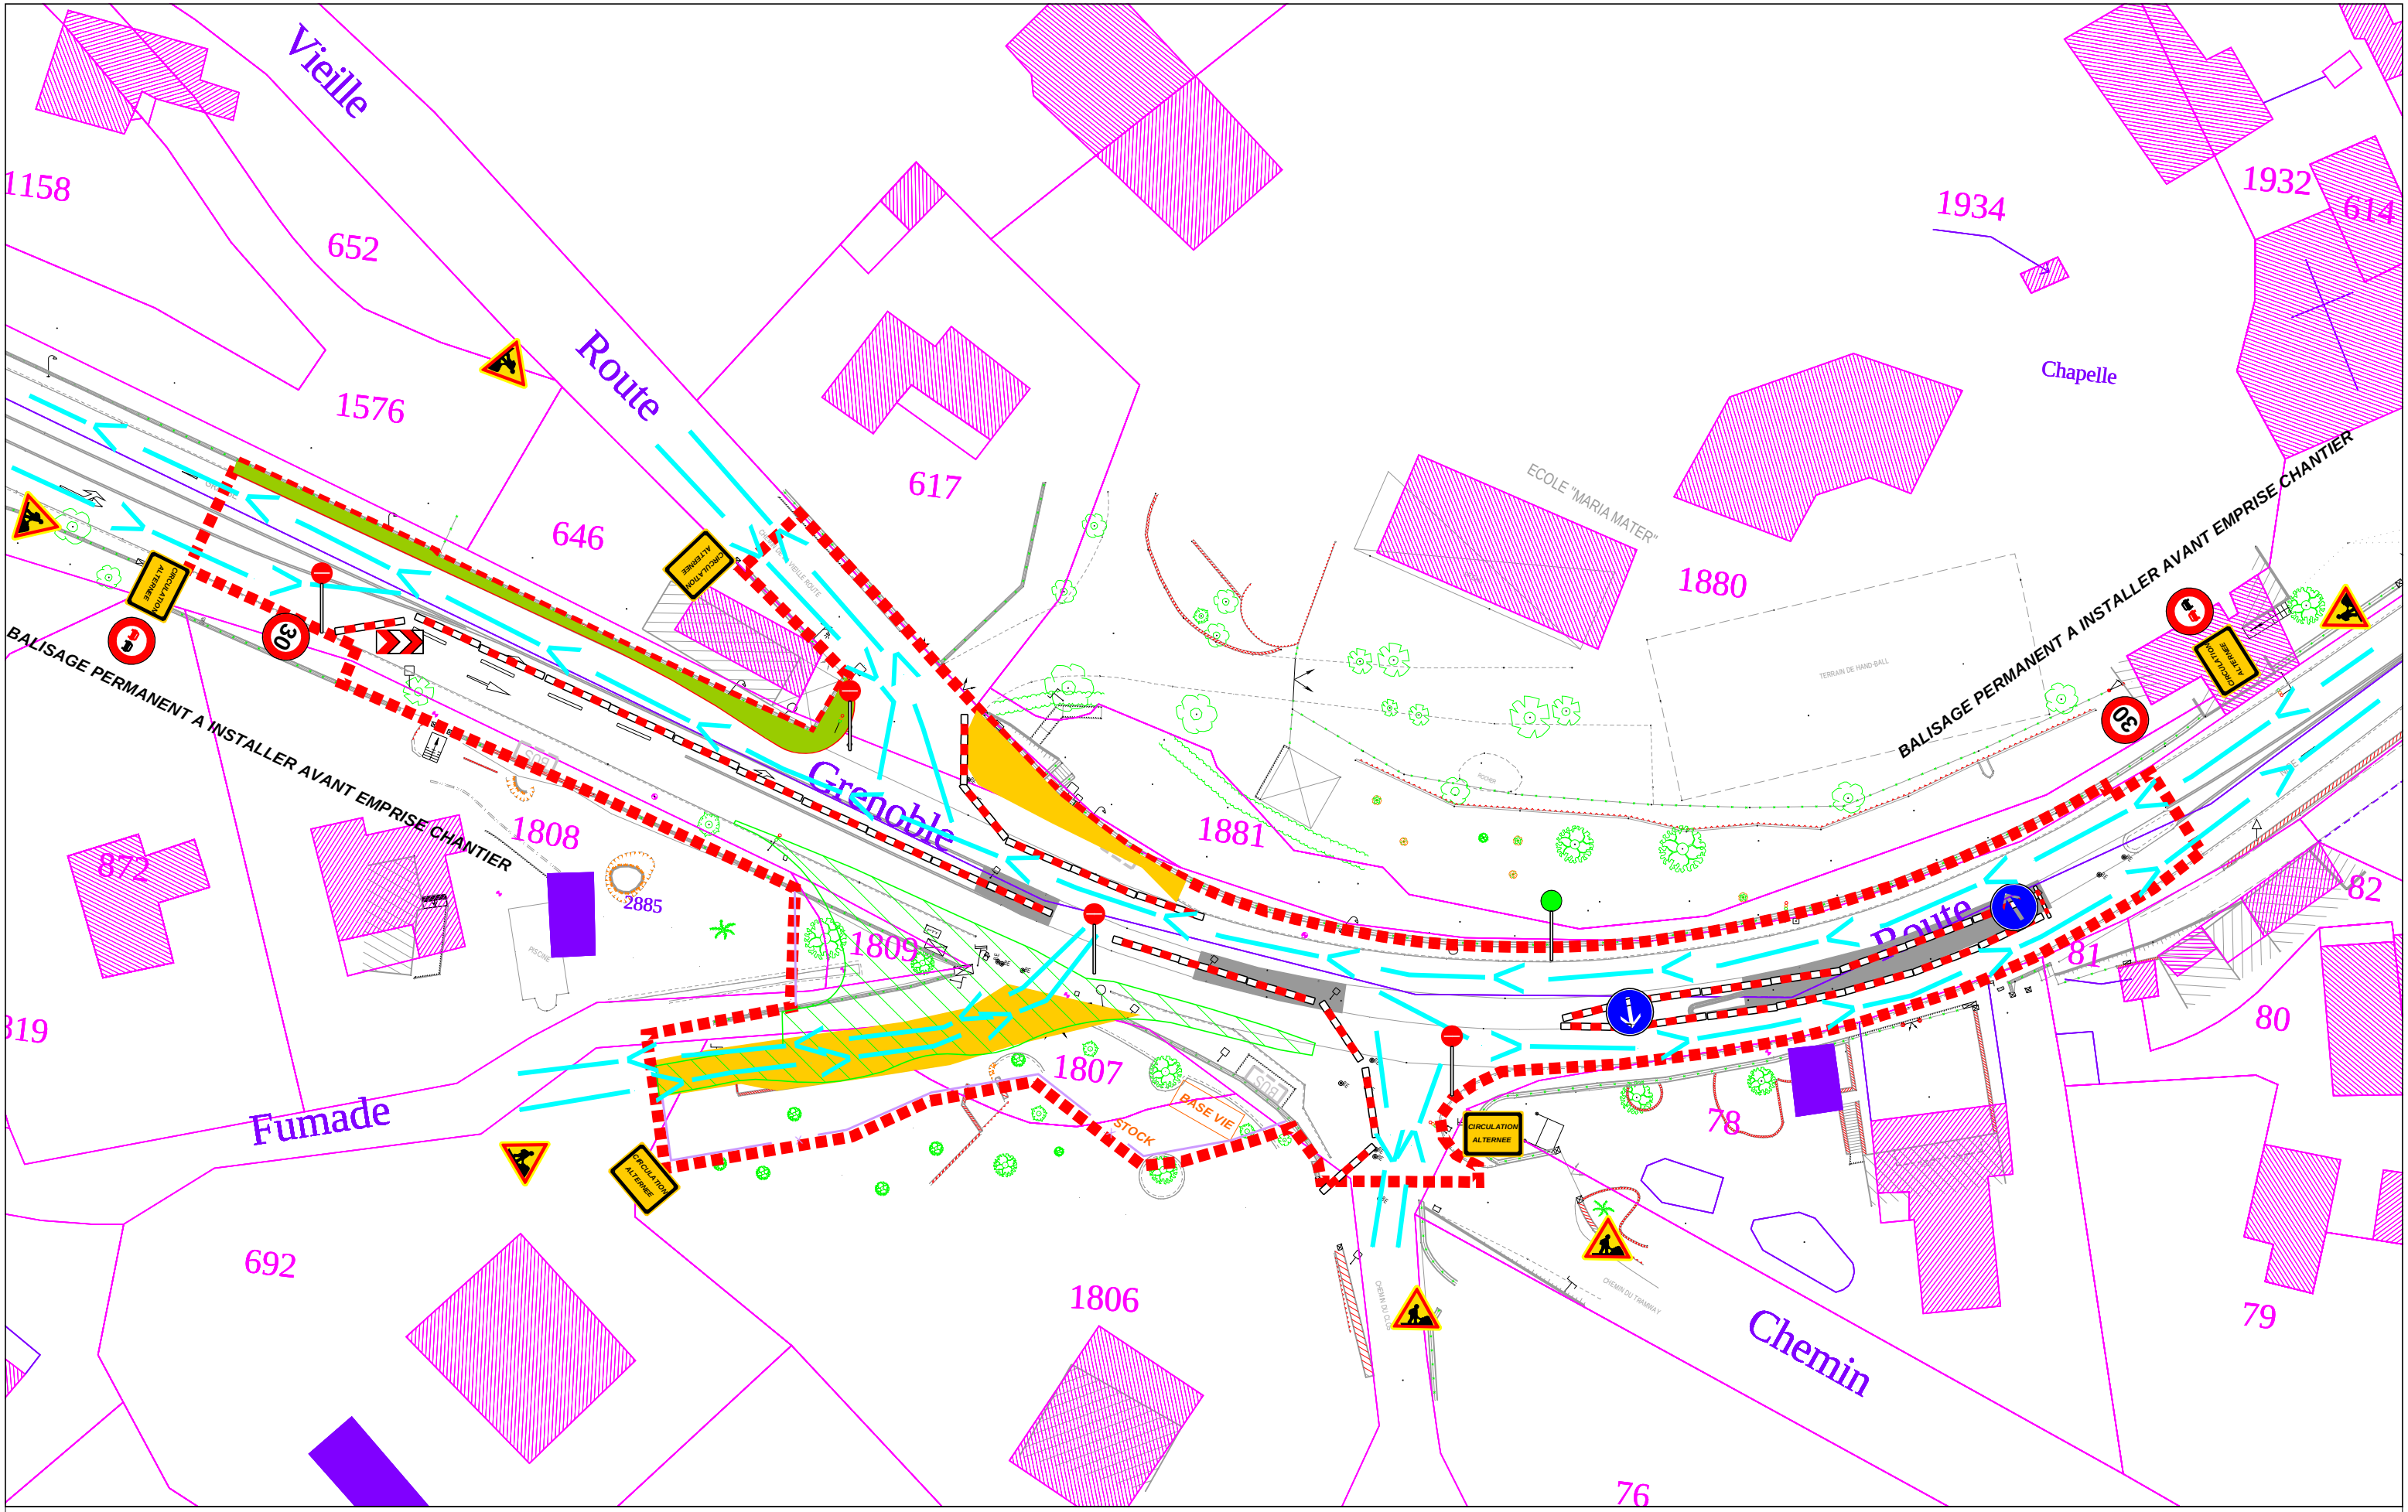


Fermeture ponctuelle de la FUMADE, circulation RD2085 voies réduites, sous alternat manuel
Feux tricolores en mode clignotant



PHASE 7 BIS- COUCHE DE GB

Chemin de la FUMADE + RD2085 demi-giratoire : réalisation de la couche de GB de nuit

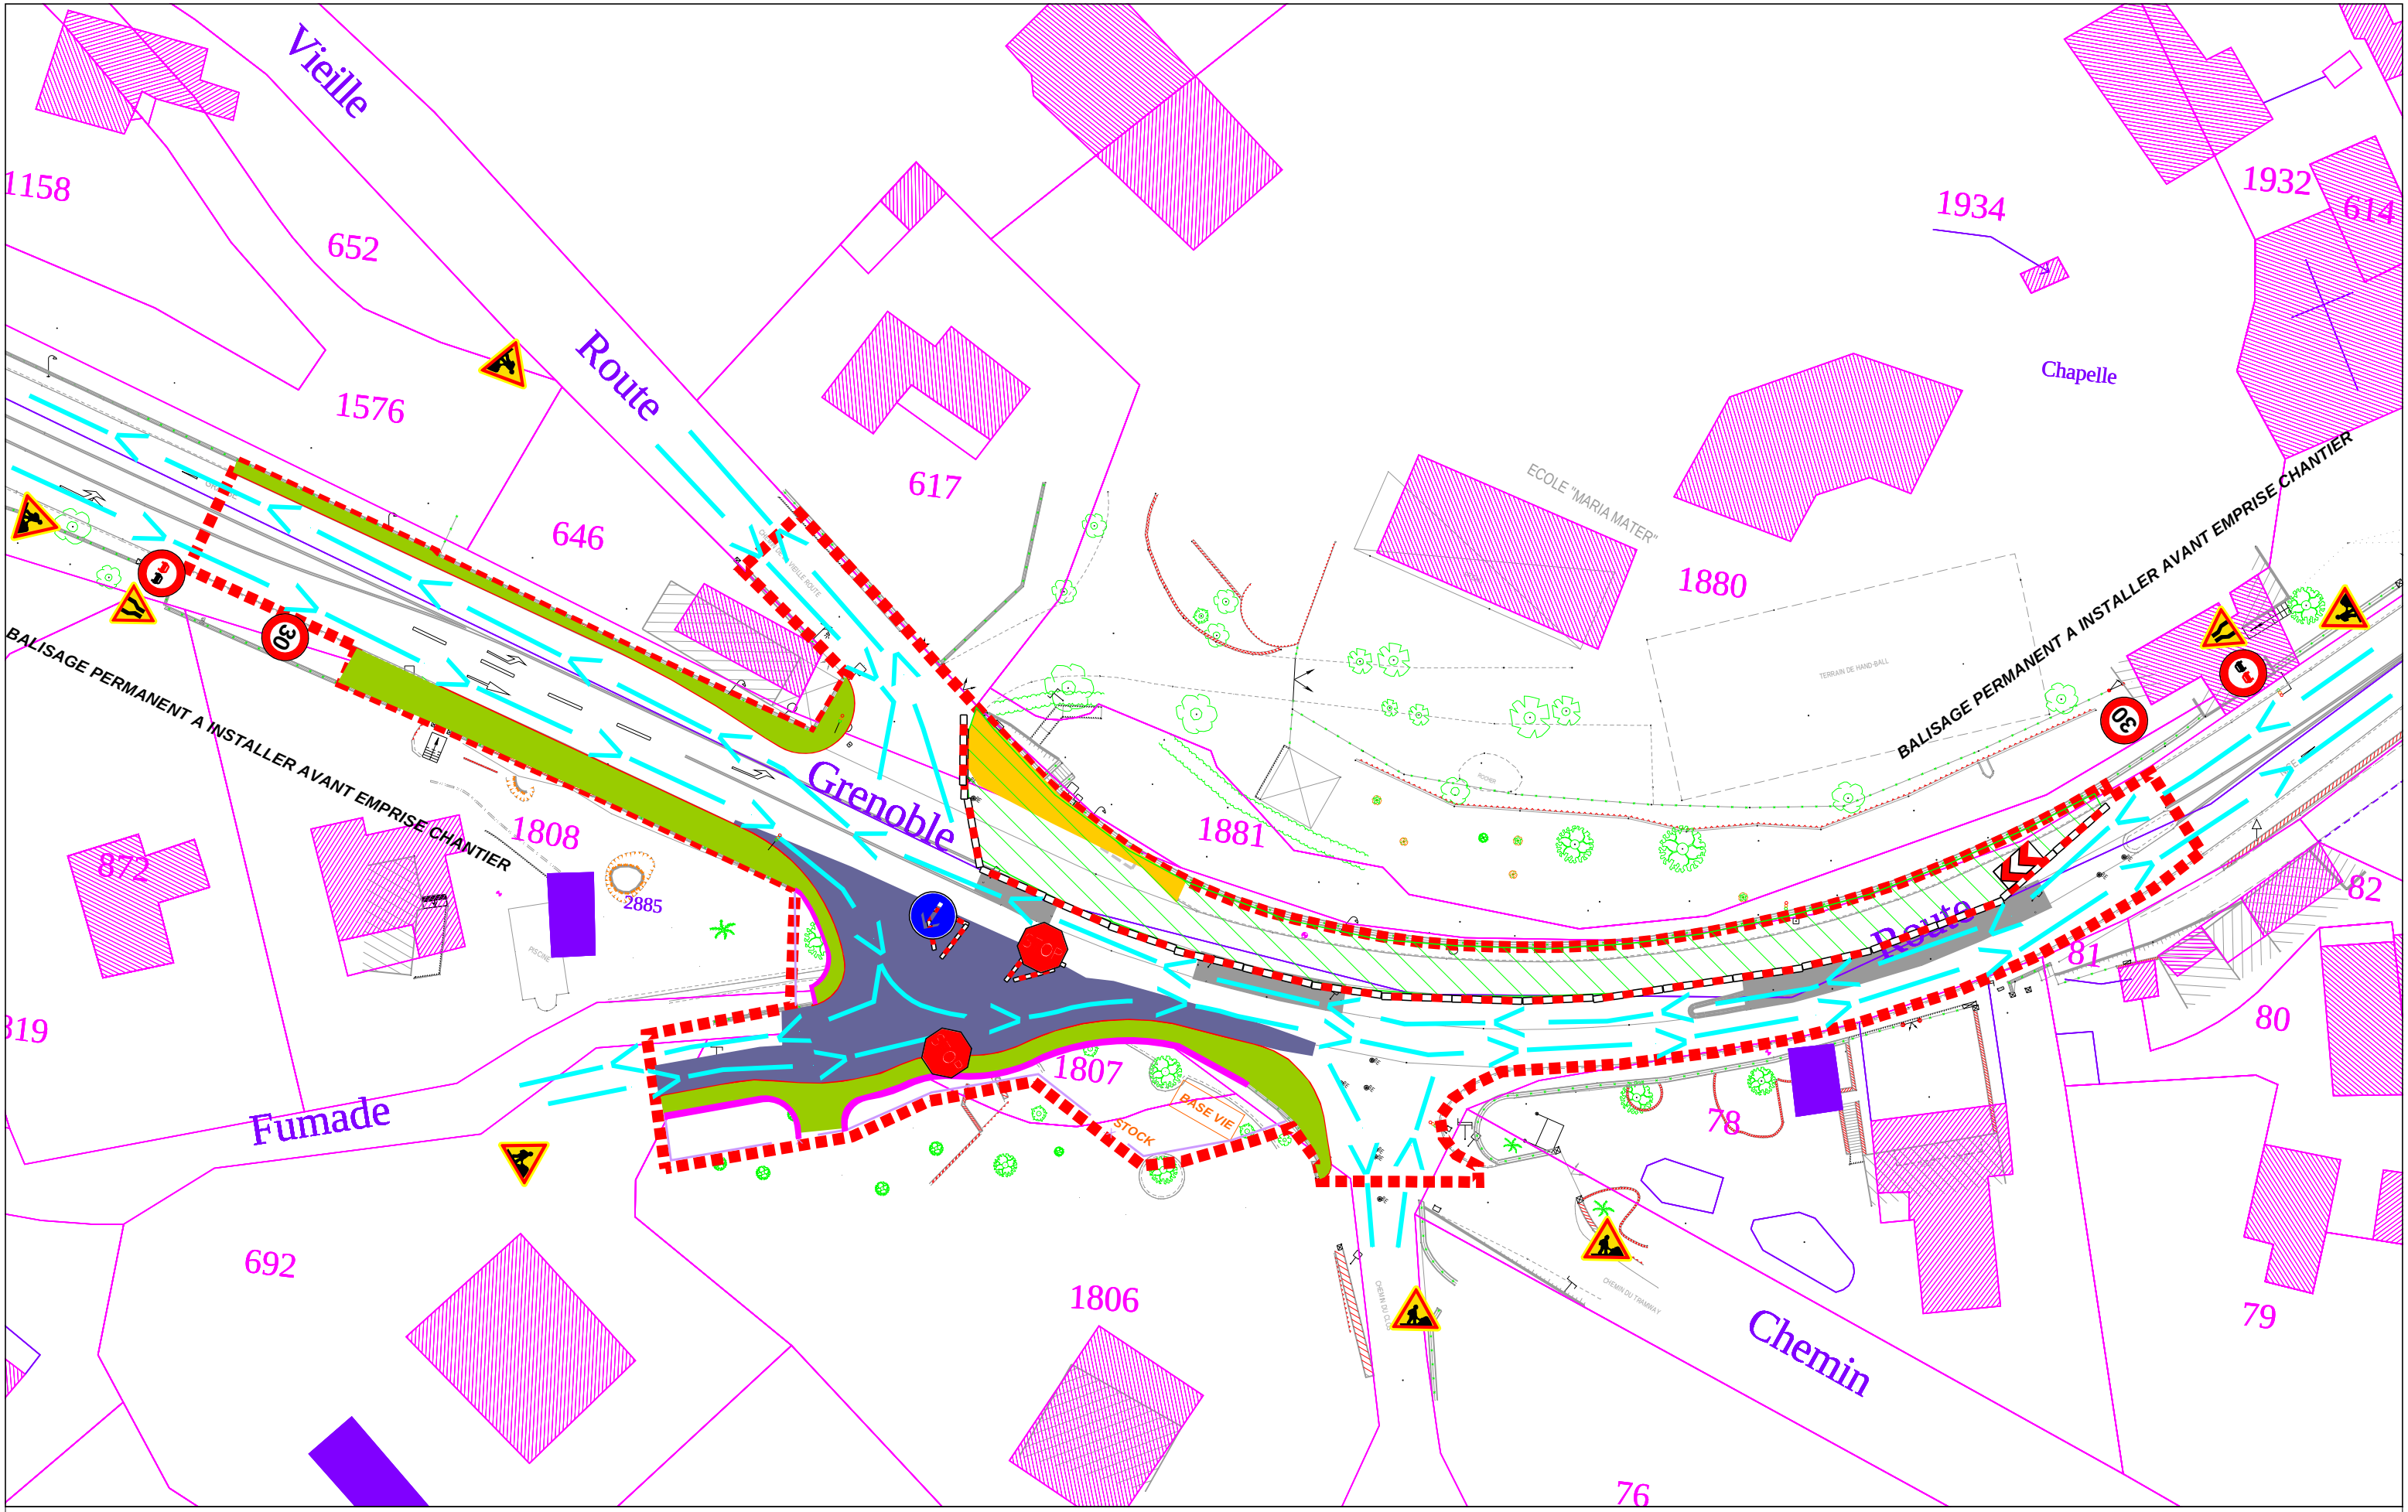


Circulation sur FUMADE sur GB, circulation RD2085 voies réduites, sous feux normaux



**PHASE 8 - BASCULEMENT DE CIRCULATION
REALISATION DU TROTTOIR NORD - EST**


Basculement de la circulation OUEST-EST sur demi-giratoire
Basculement de la circulation EST-OUEST sur voie centrale
Démolition du trrtoir NORD-EST, réalisation des bordures et GNT

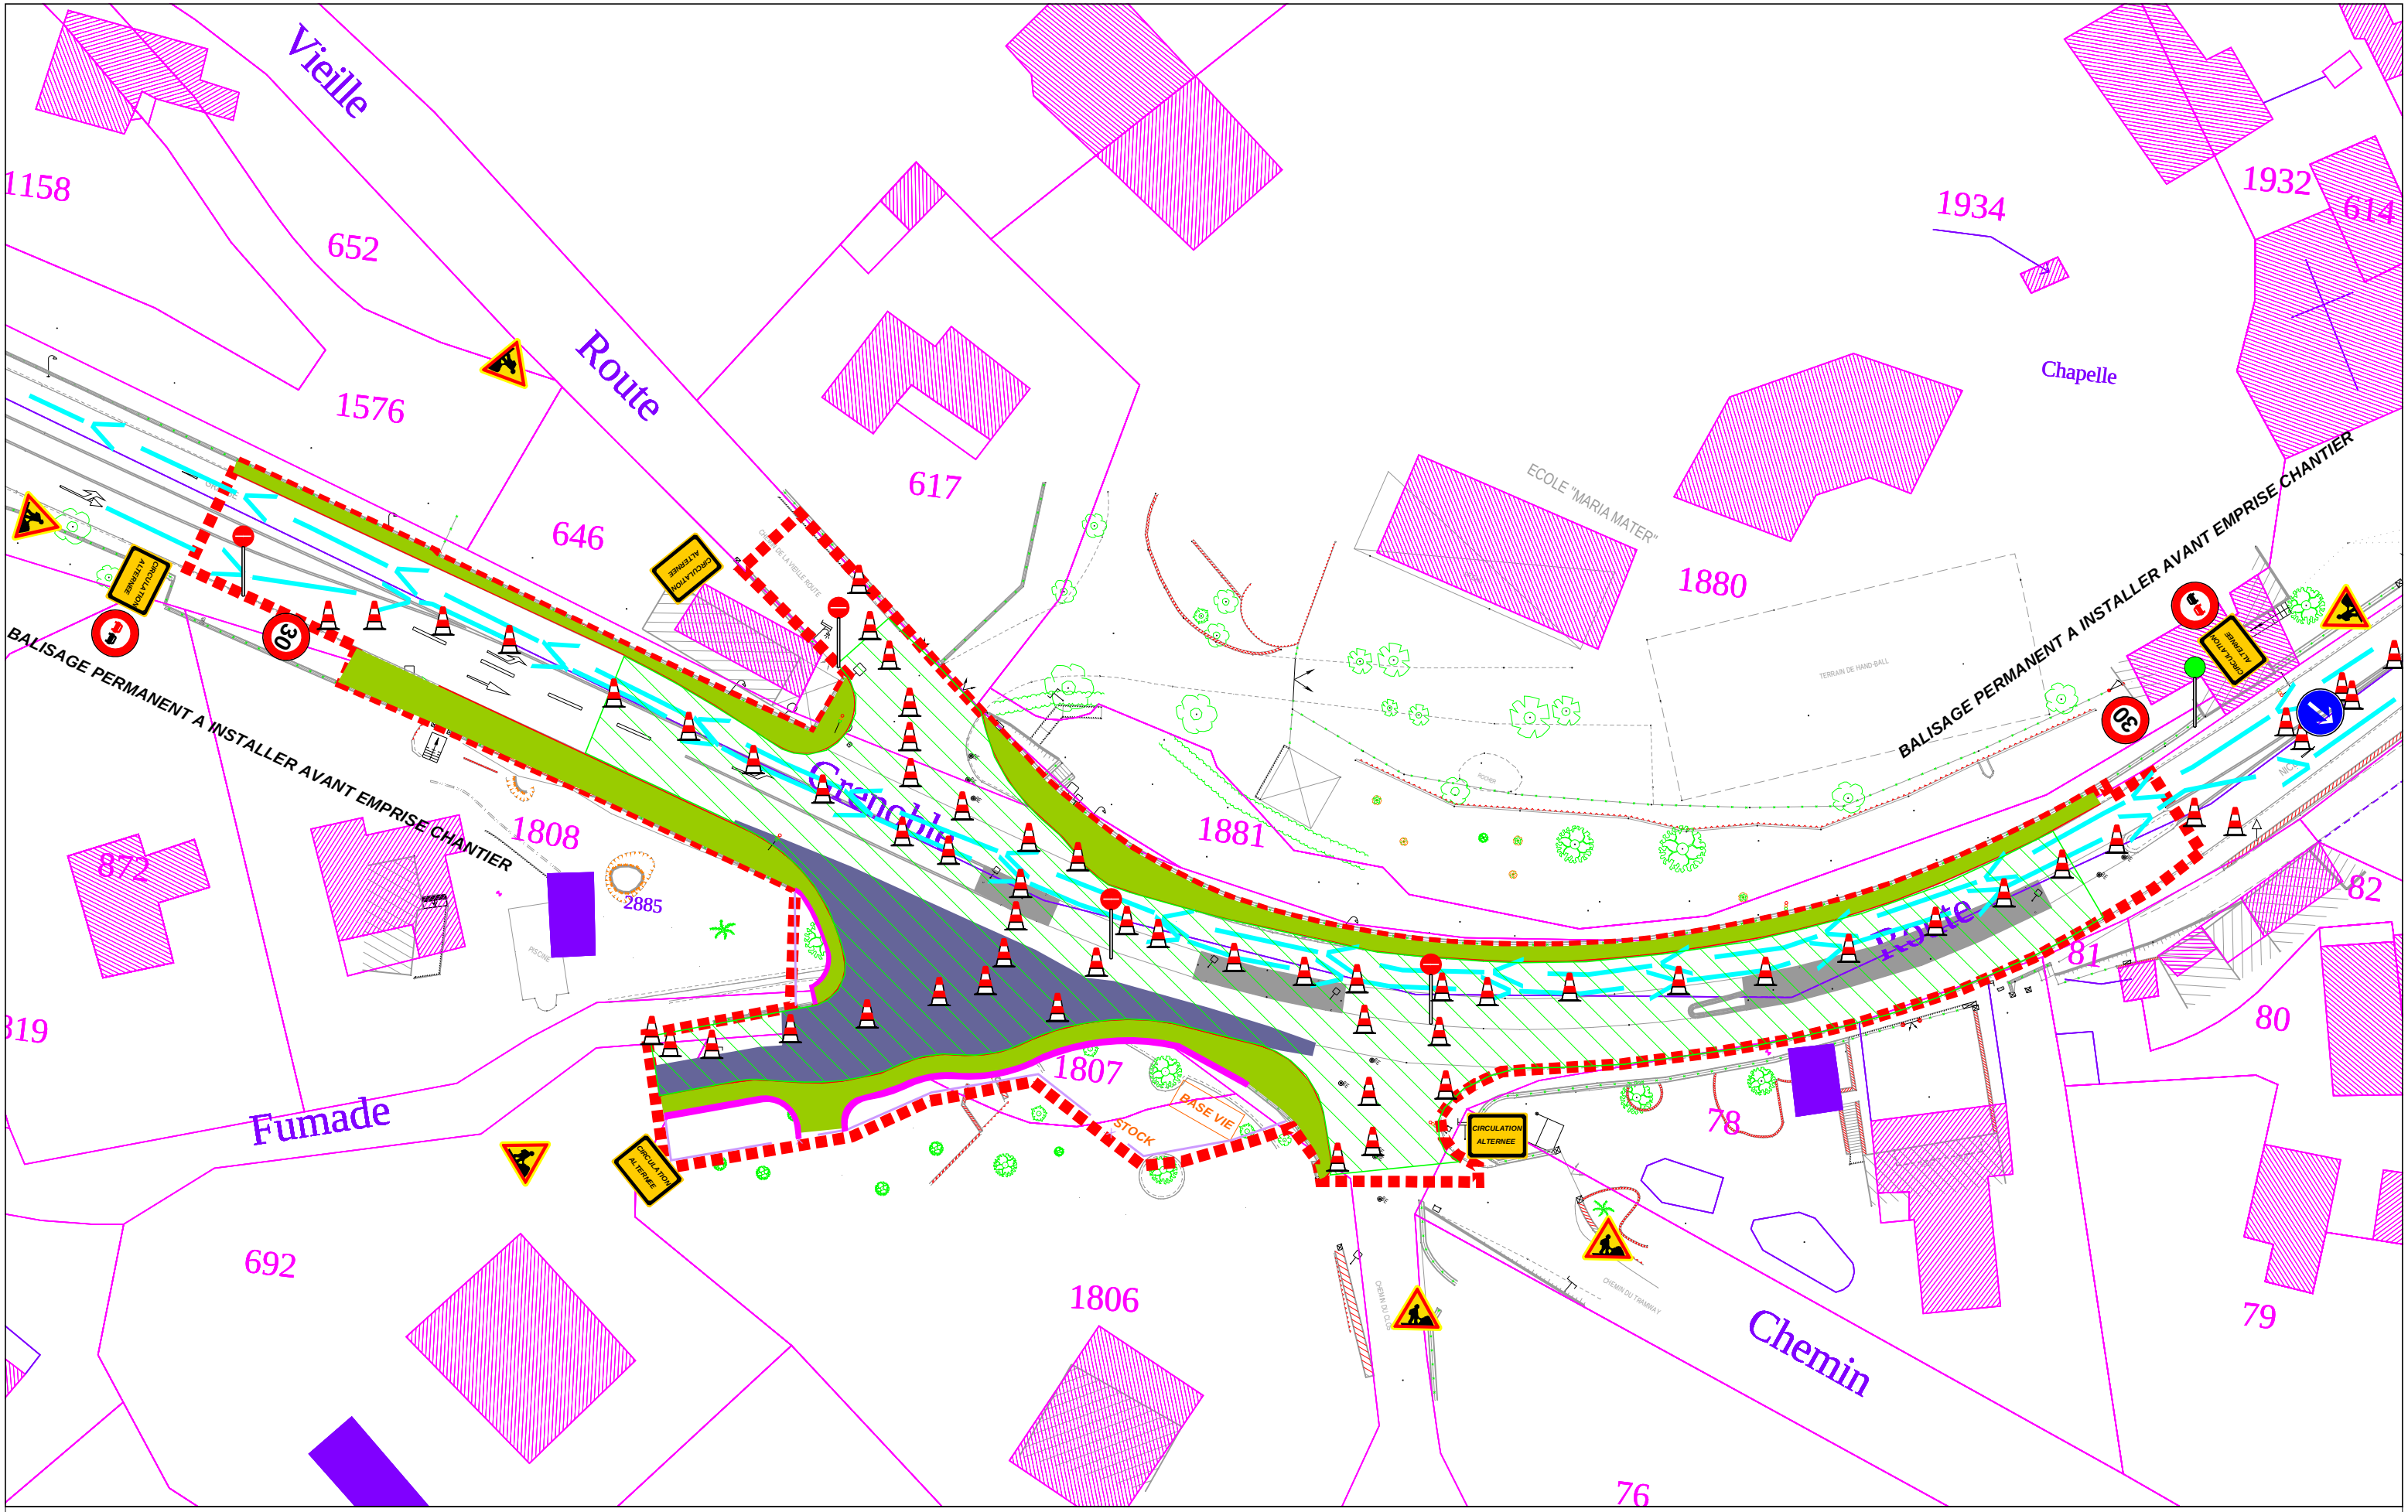

RD 2085 circulation sous alternat manuel , feux tricolores clignotants
 Horaires suivant arrete de circulation
 Réalisation du rabotage et du reprofilage général par demi-chaussée
 Fermeture ponctuelle du chemin de la FUMADE, VIEILLE ROUTE, DU CLOS




**PHASE 9 - RABOTAGE / REPROFILAGE
 SUR TOUTE L'EMPRISE - DE NUIT**

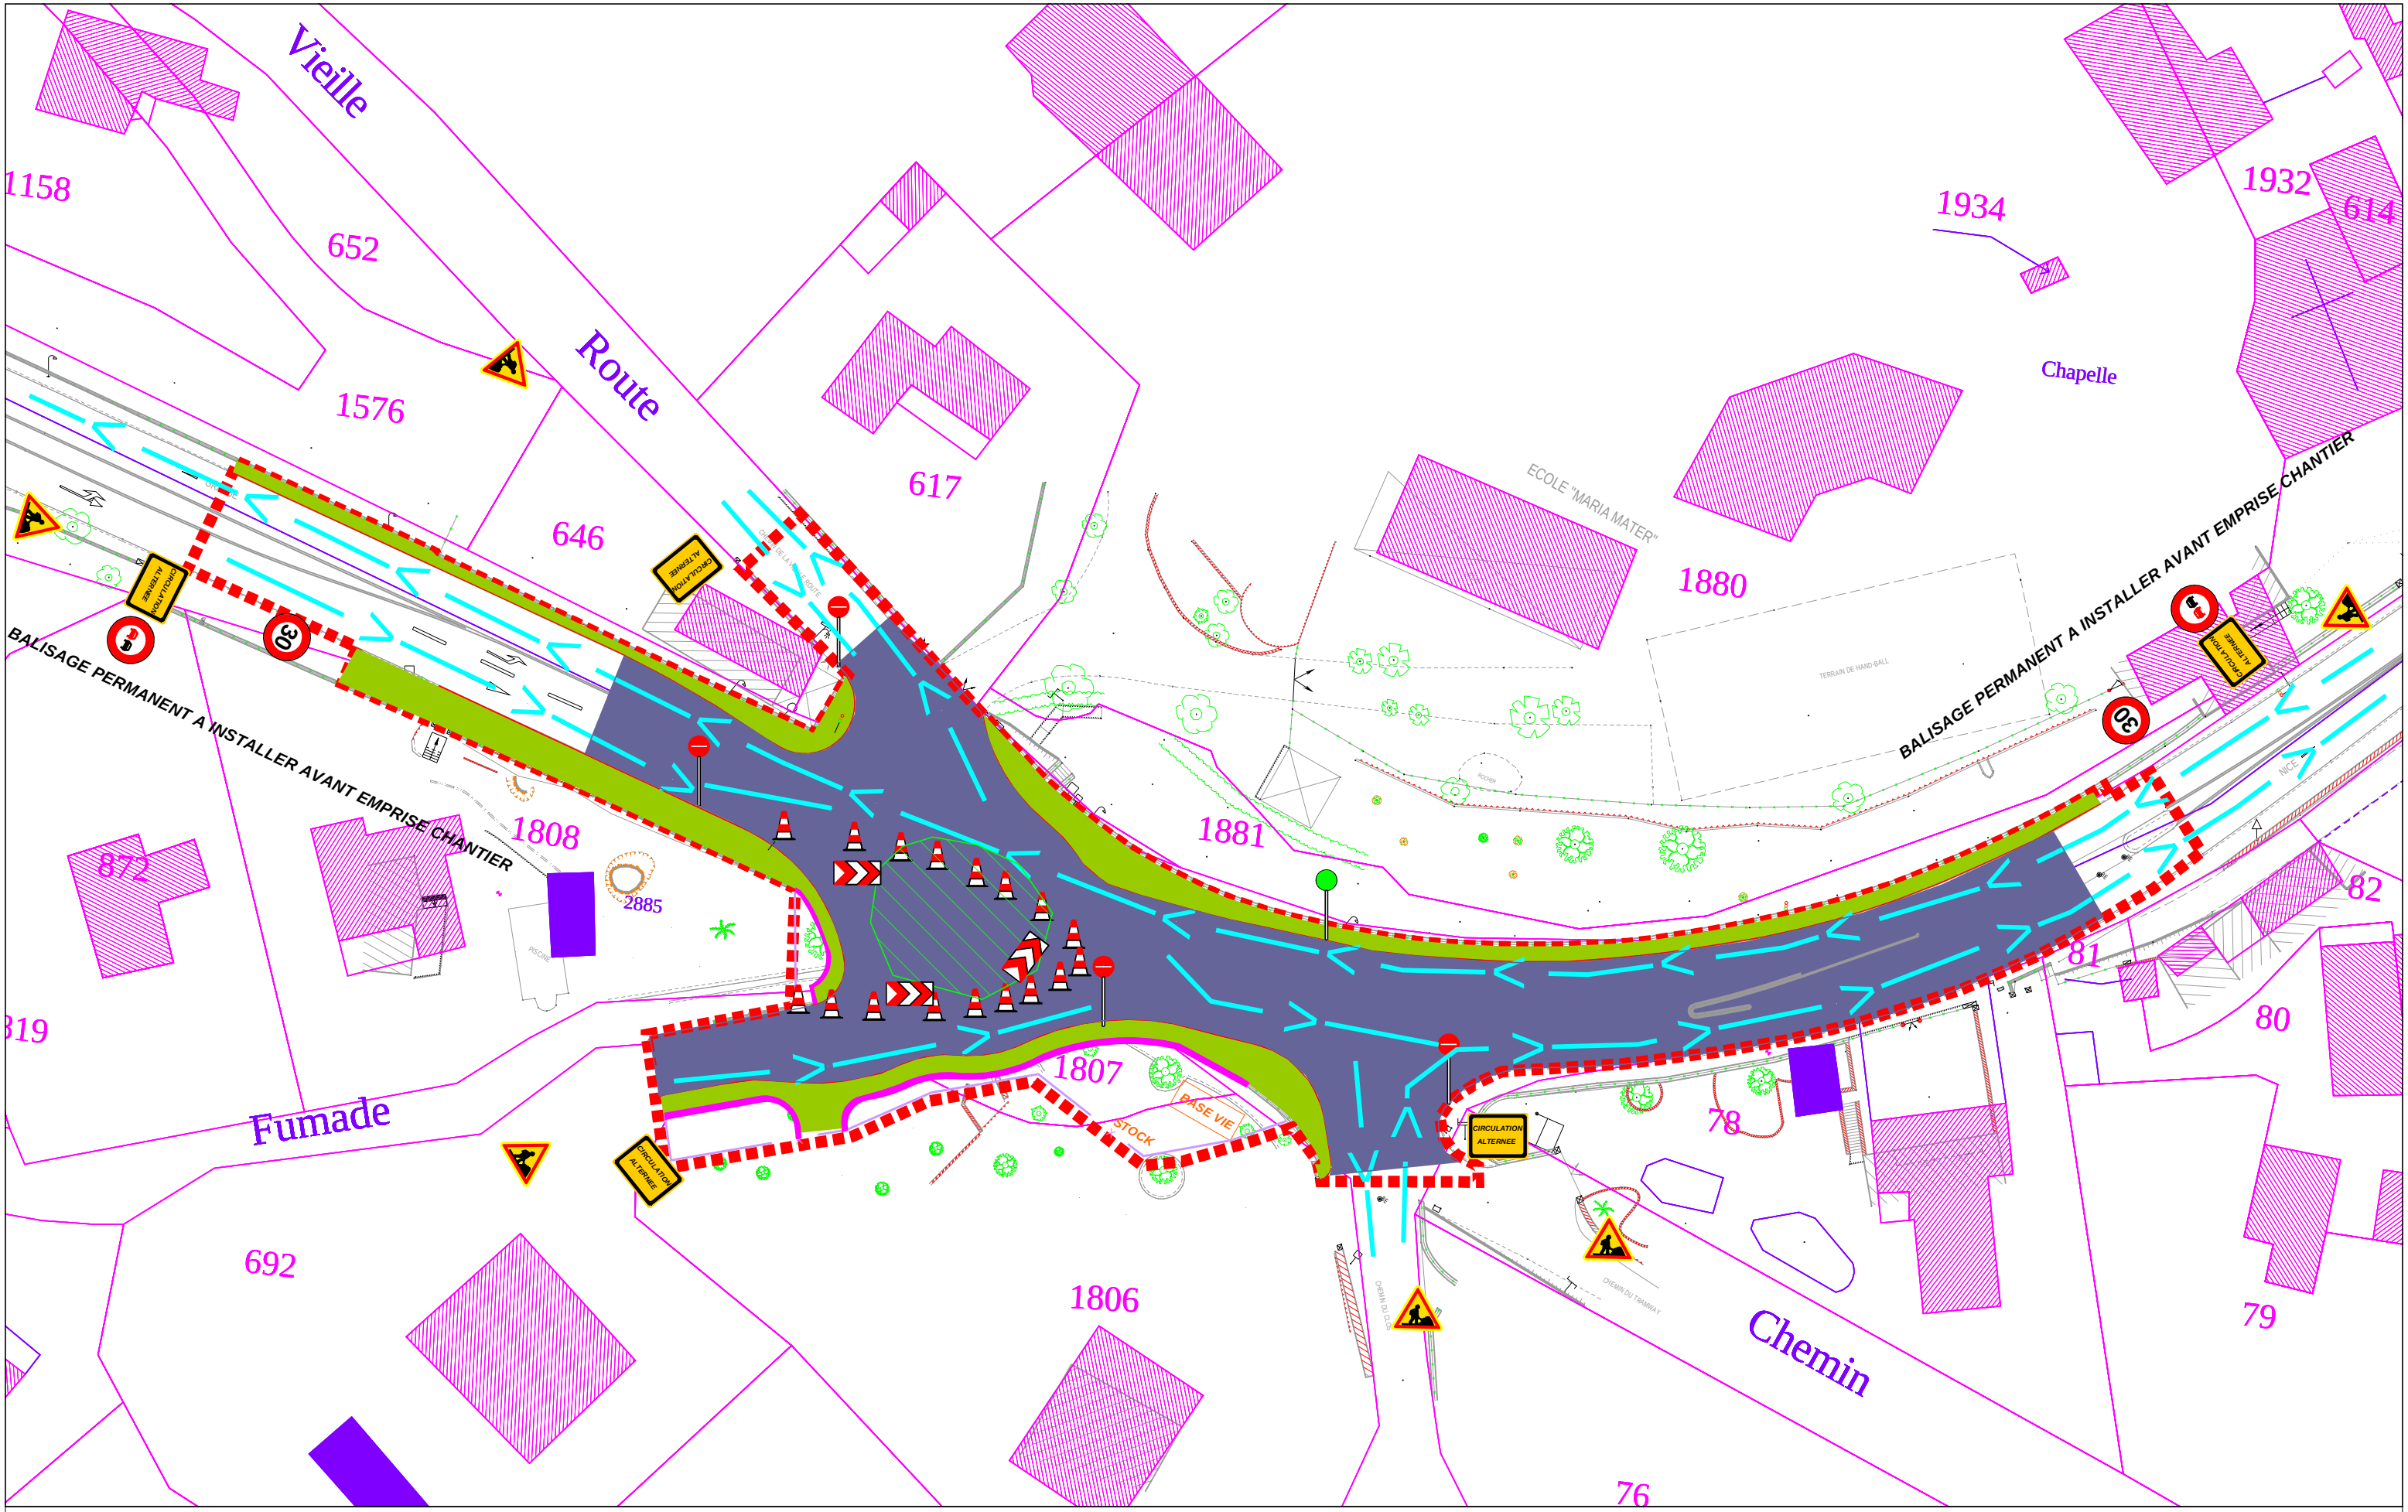

RD 2085 circulation sous alternat manuel , feux tricolores clignotants, feux normaux la nuit
Horaires suivant arrete de circulation
Réalisation des anneaux centraux par demi-chaussée.
Réalisation en 2 phases symétriques




**PHASE 10 - ILOTS CENTRE GIRATOIRE
CIRCULATION SOUS ALTERNAT**

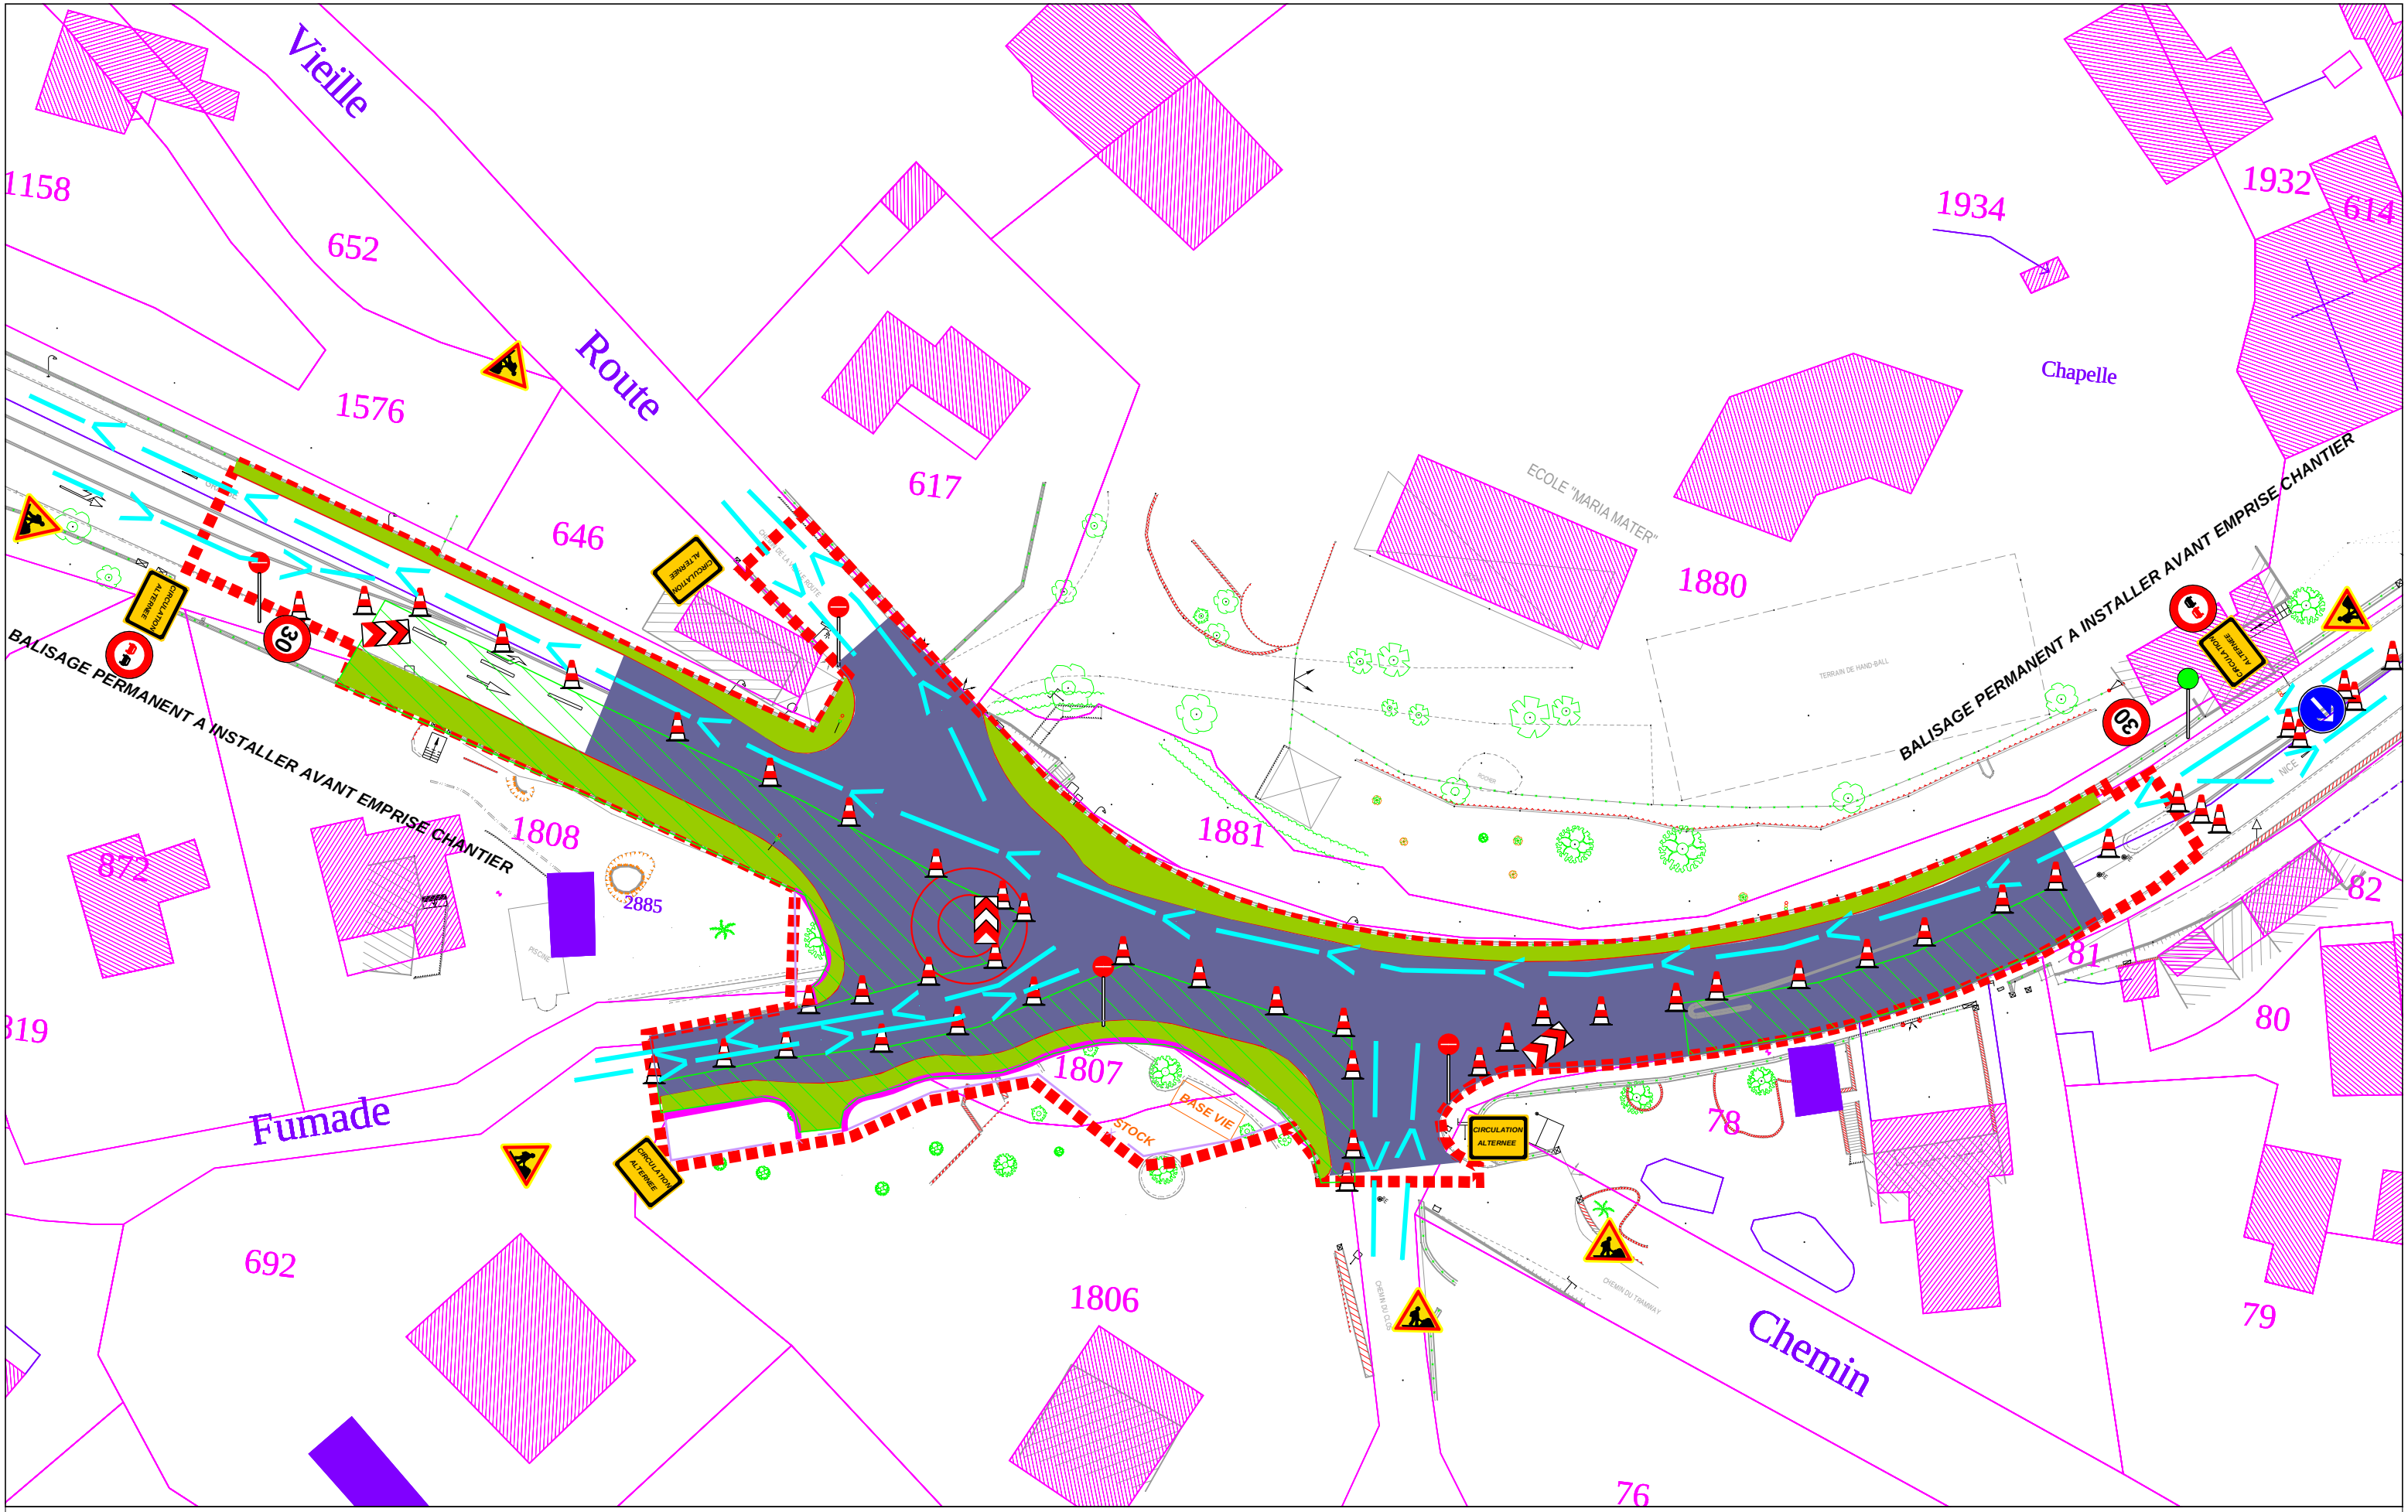

RD 2085 circulation sous alternat manuel, circulation type giratoire la nuit, horaires suivant arrete de circulation
Dépense des feux tricolores par le concessionnaire
Réalisation des ilots centraux par demi-chaussée, et des enrobés trottoirs




**PHASE 11-A - ILOTS CENTRAUX
ENROBES TROTTOIRS
CIRCULATION SOUS ALTERNAT**

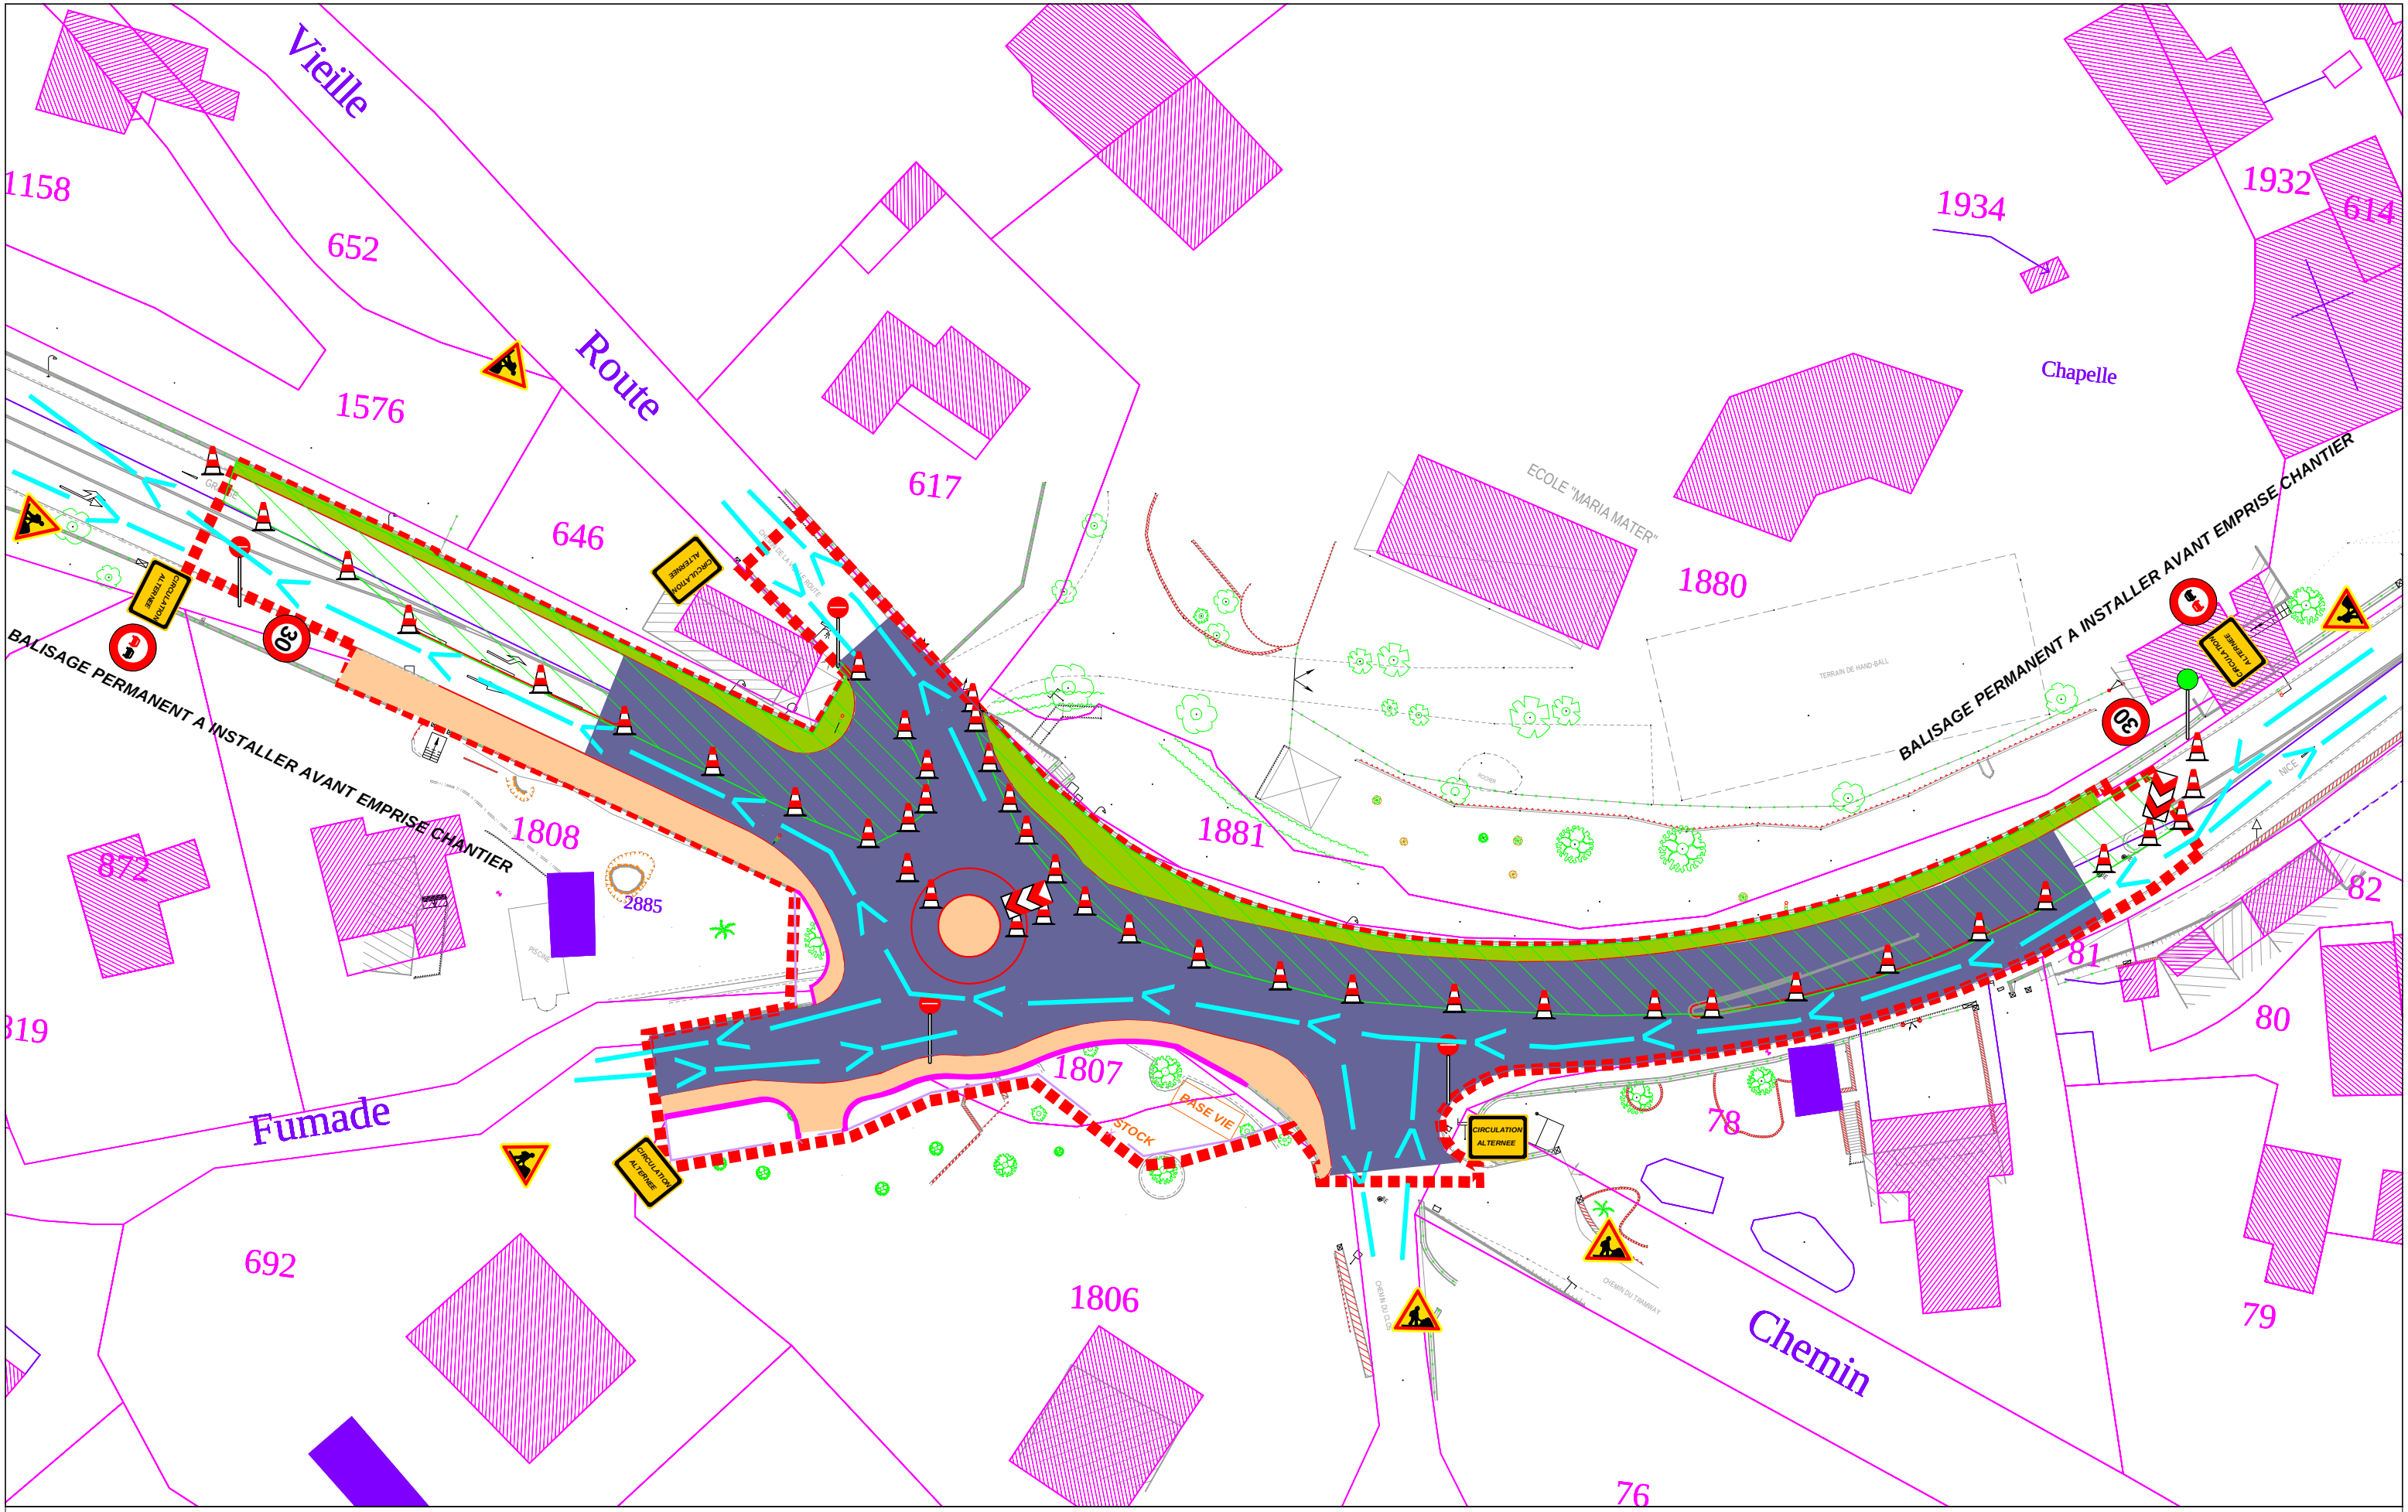

RD 2085 circulation sous alternat manuel, circulation type giratoire la nuit, horaires suivant arrete de circulation
Dépose des feux tricolores par le concessionnaire
Réalisation des ilots centraux par demi-chaussée, et des enrobés trottoirs



**PHASE 11-B - ILOTS CENTRAUX
ENROBES TROTTOIRS
CIRCULATION SOUS ALTERNAT**

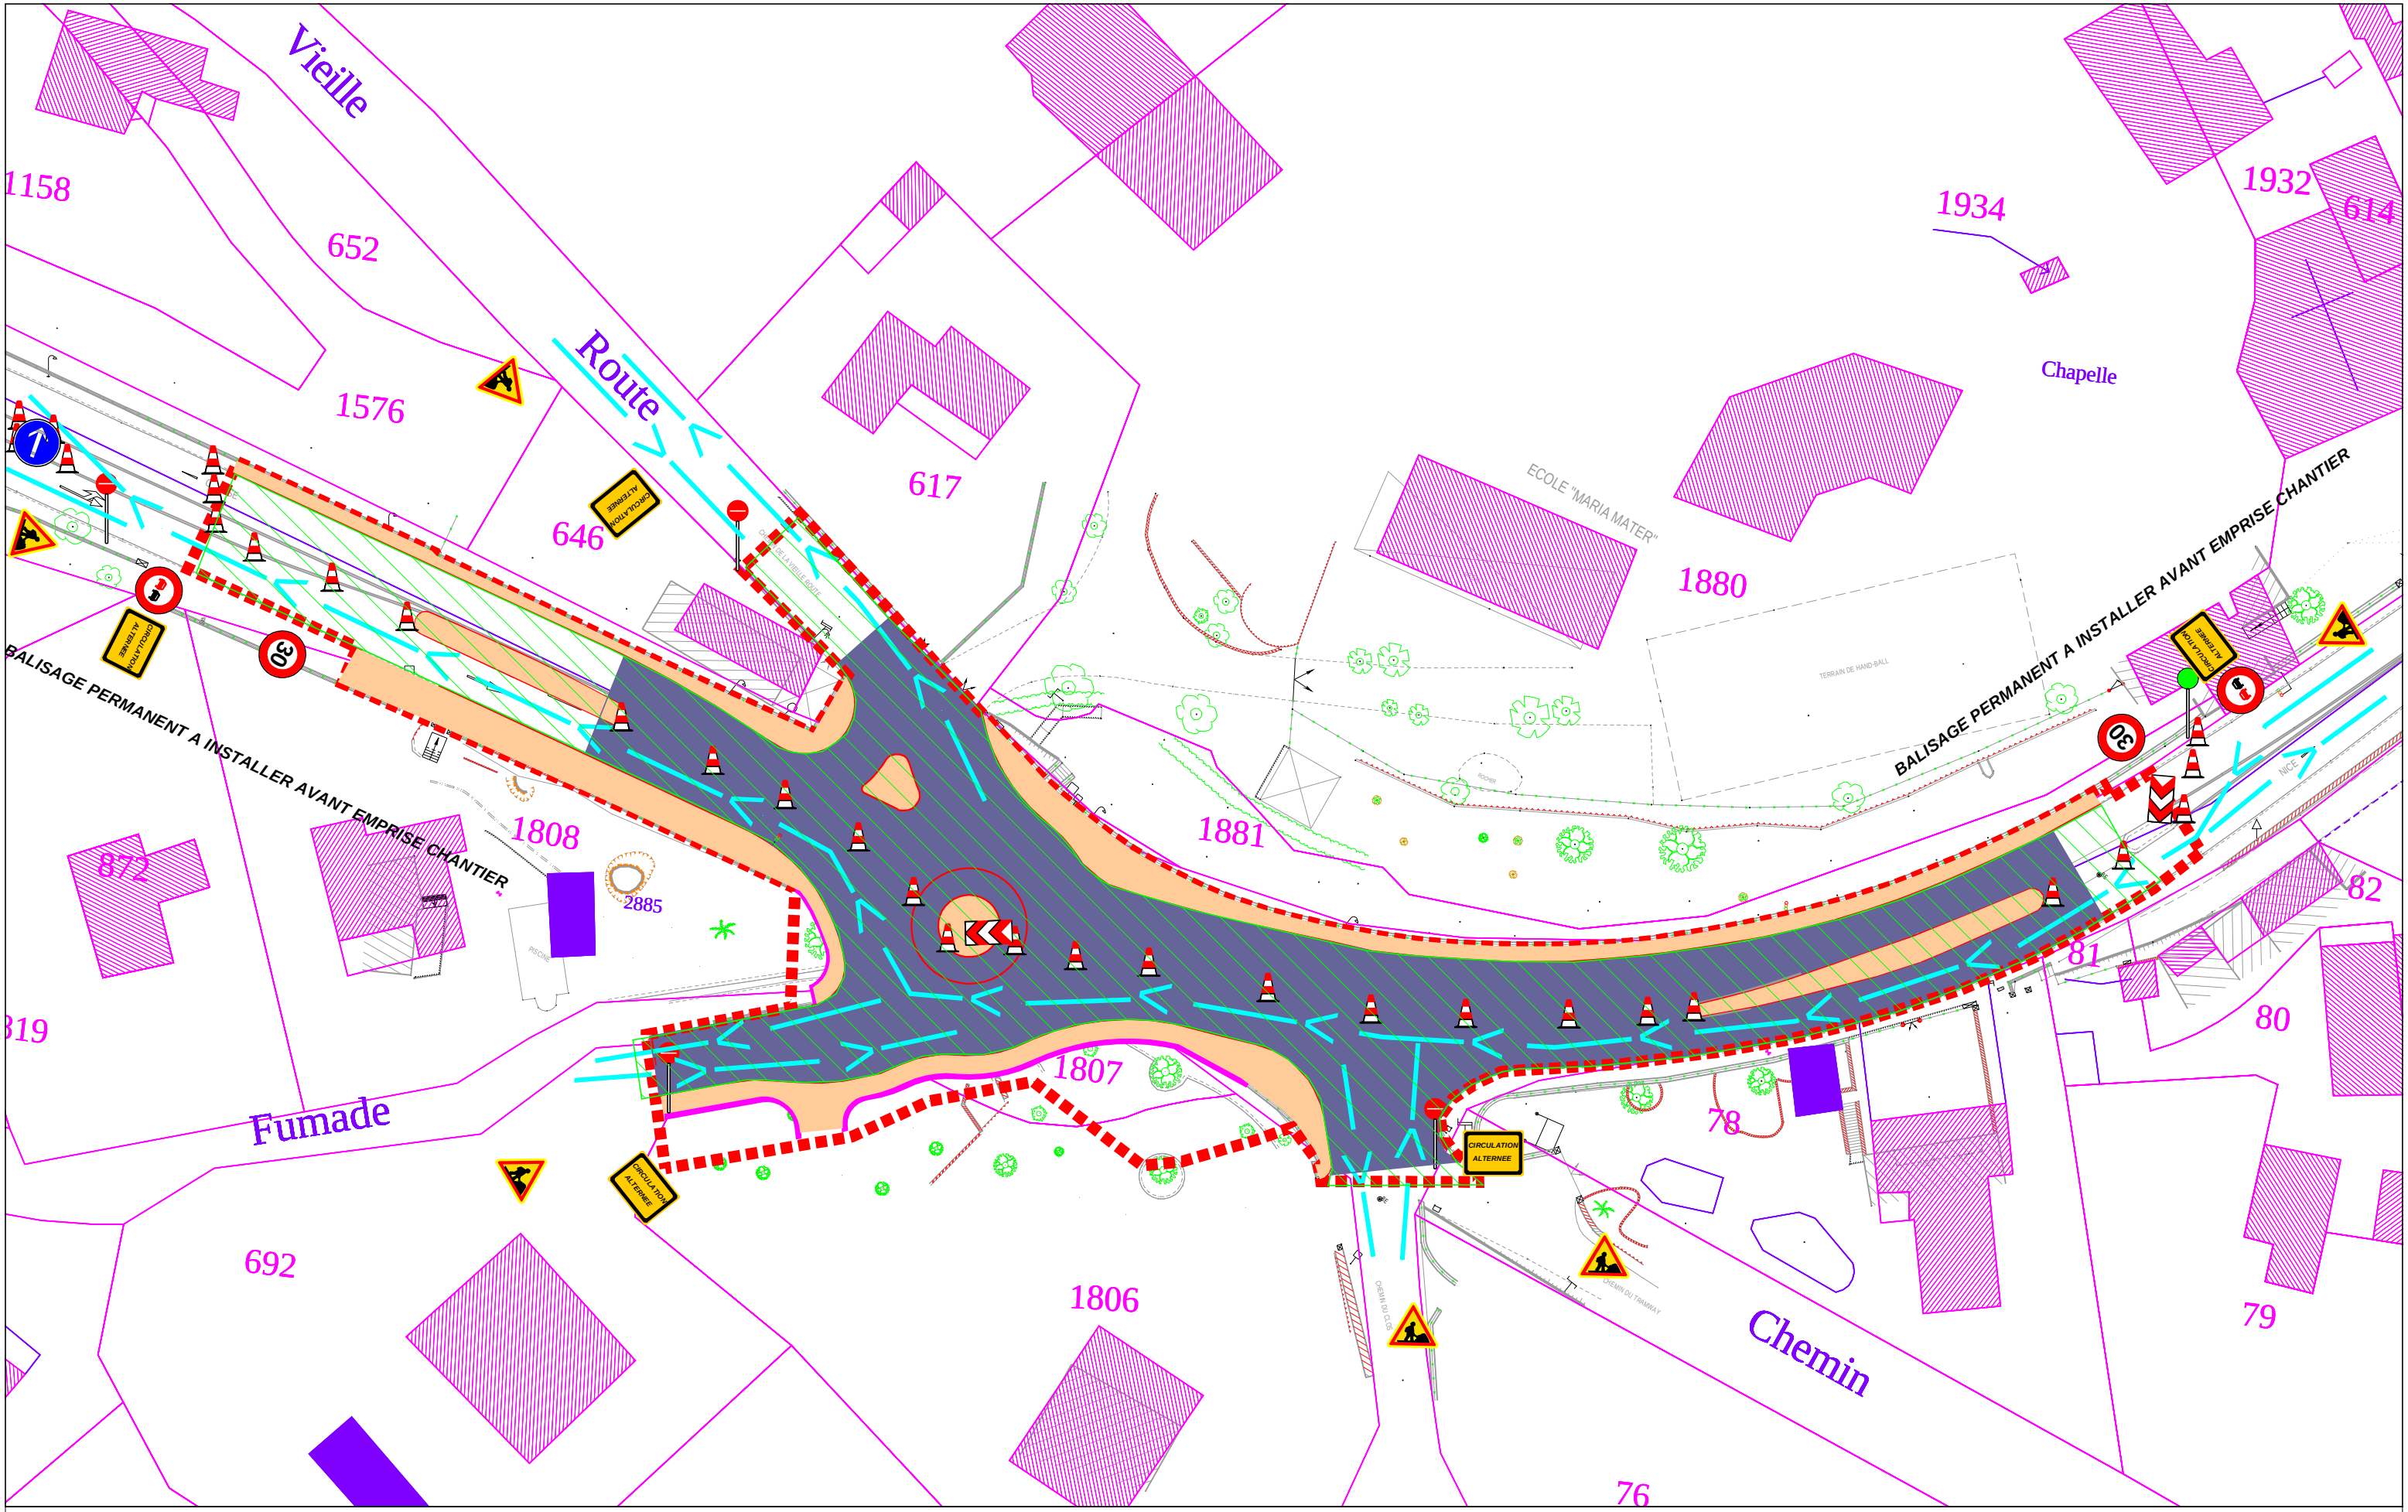

RD 2085 circulation sous alternat manuel, la journée circulation en mode giratoire
Fermeture ponctuelle FUMADE, vieille route, CLOS
Réalisation des enclaves et de la couche de roulement par demi-chaussée
Sur RD2085 et sur anneaux du giratoire
Réalisation de la signalisation Hz et Verticale



**PHASE 12 - COUCHE DE ROULEMENT
REALISATION DE NUIT
CIRCULATION SOUS ALTERNAT**
